



Yvelines • Hauts-de-Seine

**Réunion Fournisseurs Infrastructures
6 février 2025 - Orangerie Château de Sceaux**



Accueil

Nicolas LALLEMAND

**Directeur de la Commande Publique Unifiée des
Hauts-de-Seine et des Yvelines**





Programme

GIP ACTIVITY:

Térésa MACHADO, Responsable Pôle Clauses d'insertion

MOBILITES :

Céline MAURIZE, François GROS (SMO Seine et Yvelines Voirie)

François GROS (CD78)

PHILIPPE CARON (CD92)

ESPACES VERTS:

Eric GOULOUZELLE (CD92)

EAU:

Sylvie DRIOLLET (CD92)





Informations utiles

Vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à compter du 7 février à l'adresse suivante:

<https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs>





Présentation de la Direction de la Commande Publique Unifiée des Hauts-de-Seine et des Yvelines




Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

6 février 2025



Organigramme de la Direction de la Commande Publique Unifiée

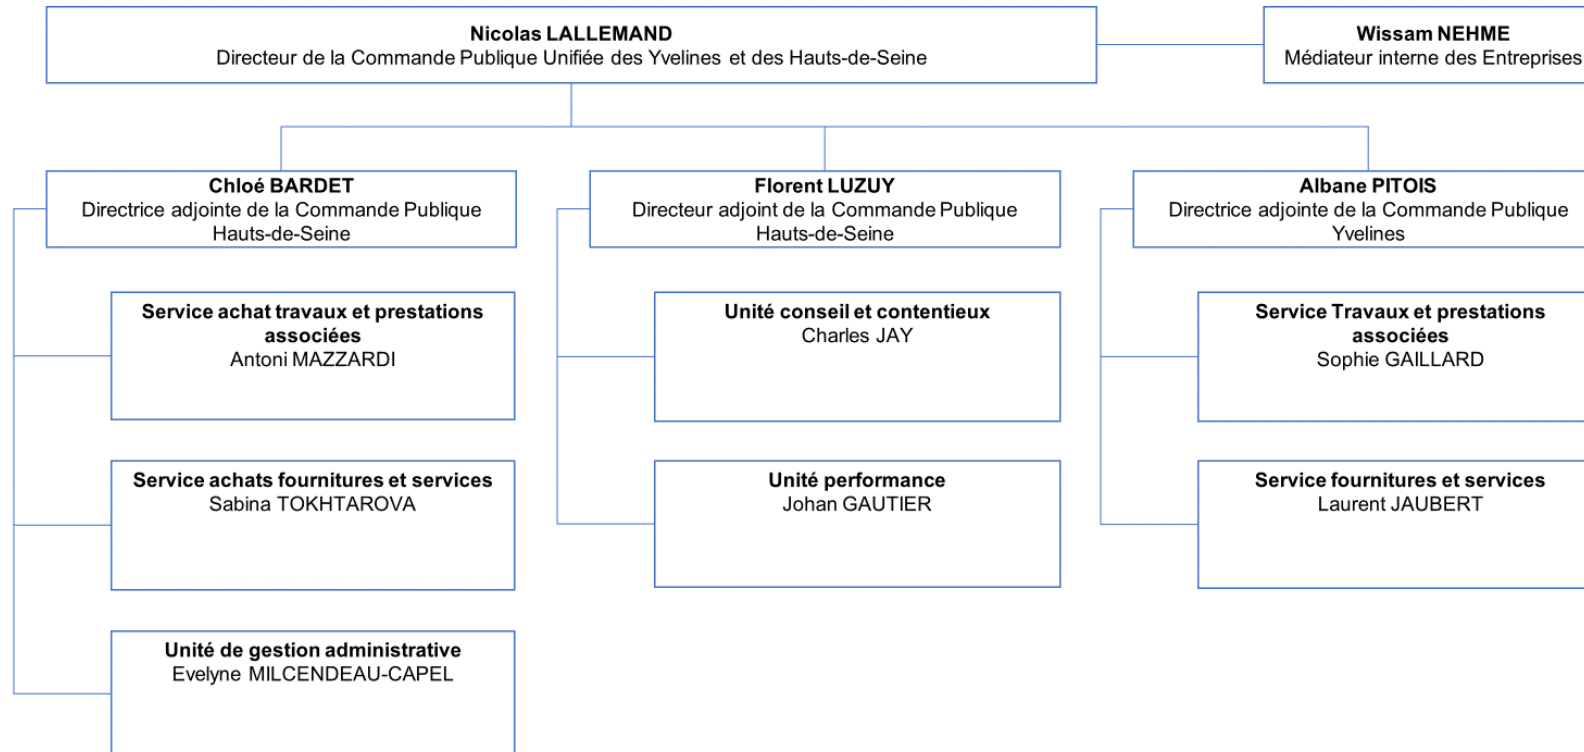



Pour consulter nos annonces et télécharger nos DCE rendez-vous sur :

Pour le CD78 : <https://www.achats.yvelines.fr/>

Pour le CD92 : <https://achats.hauts-de-seine.fr/>





Comment saisir le médiateur Interne des Entreprises?

Le médiateur interne des entreprises des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine peut être saisi, directement par courriel, d'une difficulté rencontrée par une entreprise dans ses relations avec l'un des deux Départements. Dans ce cadre, il s'attachera à trouver, en lien avec les services concernés, les éléments de réponse au différend qui lui est soumis.

Pour le contacter, vous pouvez adresser un courriel à l'adresse suivante :

mediationdesentreprises@78-92.fr





Cellule de Contacts de la Commande Publique

Vous souhaitez candidater pour l'attribution d'un marché public ou d'une concession du Département des Hauts-de-Seine et vous avez une question portant sur les points suivants :

Une aide pour mieux comprendre les démarches administratives à connaître pour répondre aux marchés publics

Un appui pour vous aider à mieux comprendre le dossier de consultation

Des conseils pour préparer vos dossiers de candidature sur le plan administratif



Pour les Hauts-de-Seine

<https://www.78-92.fr/commande-publique/contact-hauts-de-seine>

Pour les Yvelines

<https://www.78-92.fr/commande-publique/contact-yvelines>





Chiffres clefs de la commande publique des Hauts-de-Seine et des Yvelines

Chiffres 2024 dans les Hauts-de-Seine

514 M€ d'achats réalisés dont 341 M€ d'investissement et
173 M€ de fonctionnement
229 marchés supérieurs à 40 k€ HT

Chiffres 2024 dans les Yvelines

305 M€ d'achats réalisés dont 200 M€ d'investissement et
105 M€ de fonctionnement
193 marchés supérieurs à 40 k€ HT





Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER)

Le 17 décembre 2021, les assemblées des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont adopté simultanément leur **Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER)**.

A travers ce schéma, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine souhaitent promouvoir un achat public durable et responsable qui concourt à la protection ou la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et du développement économique de l'ensemble des acteurs concernés.





Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER)

Ce schéma permet de décliner la politique d'achat autour des 4 valeurs suivantes :

1. La **proximité** autour de la dynamisation du tissu économique, la simplification des formalités administratives, l'accès à l'information et la réduction des délais de paiement ;
2. La **solidarité**, à travers notamment le développement du caractère solidaire et responsable de l'achat, la promotion de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), l'augmentation et la diversification des clauses d'insertion dans les marchés ;
3. **Une commande publique durable et décarbonée** qui prenne en compte l'impact environnemental dans la définition des besoins, l'approche en coût complet, l'insertion de clauses environnementales dans les marchés et la recherche d'actions visant à favoriser l'économie circulaire ;
4. **Une commande publique efficiente** qui renforce la professionnalisation de la fonction achat et développe les pratiques innovantes et performantes.





Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables

La Médiation des Entreprises du Ministère de l'Économie et des Finances et le Conseil National des Achats ont décerné le label « **Relation Fournisseurs et Achats Responsables** » au Département des Hauts-de-Seine le 17 décembre 2021 et au Département des Yvelines le 4 octobre 2022

Ce label



est élaboré à partir de la **norme ISO20400 « Achats Responsables »**

distingue les entreprises ou entités publiques ayant fait la **preuve de relations durables et équilibrées** avec leurs fournisseurs

comprend des engagements portant notamment sur l'impact des achats sur la compétitivité économique et l'intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans les processus d'achat



A  TIVIT 

L'agence d'insertion Hauts-de-Seine & Yvelines

**DES SOLUTIONS POUR FAIRE AVANCER L'EMPLOI ENSEMBLE
SUR NOS TERRITOIRES**

ACTIVITY' HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES

OPÉRATEUR INTERDEPARTEMENTAL de la politique
d'insertion professionnelle



INTERLOCUTEUR DES ENTREPRISES ET DES ACHETEURS pour la RSE


LA GOUVERNANCE D'ACTIVITY



Yvelines
Le Département



L'agence d'insertion Hauts-de-Seine & Yvelines



LA CLAUSE SOCIALE D'INSERTION DANS LES YVELINES

UN RÉSEAU D'INTERLOCUTEURS EXPERTS AU PLUS PRÈS DES
ENTREPRISES ET DES PUBLICS

8

FACILITATEURS/TRICES SUR LE
TERRITOIRE YVELINOIS

1

ENTRÉE UNIQUE APRÈS ATTRIBUTION QUI
ORIENTE VERS LE FACILITATEUR LOCAL

Anne Marien

Responsable ingénierie Clauses d'insertion

Tél : 01 39 07 80 82/ 06 99 86 26 74

@ : amarien@agence-activity.fr

LA CLAUSE SOCIALE D'INSERTION DANS LES HAUTS DE SEINE

UNE EXPERTISE GLOBALE ORIENTÉE SUR LE CONSEIL, L'ACCOMPAGNEMENT ET
LE CONTRÔLE DE LA RÉALISATION



2



INTERLOCUTEURS DÉDIÉS

Myriam LIS

Responsable ingénierie clauses d'insertion

Tél : 06 69 38 31 88

@ : mlis@agence-activity.fr

Bruno DUCAMP

Facilitateur clauses d'insertion

Tél : 06 69 04 02 86

@ : bducamp@agence-activity.fr

LA CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

BILAN 2024 dans le département des Hauts-de-Seine

219 550 heures réalisées


377 participants en parcours clause d'insertion

42% BRSA


Profil des salariés recrutés



90% des salariés ont un niveau de formation égal ou < au niveau 3 (CAP/BEP)




<26 ans
18%



De 26 à 40 ans
47%




de 41 à 50 ans
16%



51 ans et +
19%

Répartition des heures par secteur d'activité



Construction de
Infrastructures et Travaux
Publics
40%



Restauration
collective
30%




Espaces
Verts
7%



Nettoyage de locaux
9%

ACTIVIT'Y

L'agence d'insertion Hauts-de-Seine & Yvelines



Pour tout renseignement :
contact@agence-activity.fr
Site internet : www.agence-activity.fr



Yvelines
Le Département





MOBILITES SMO Seine et Yvelines Voirie



Yvelines • Hauts-de-Seine

Réunion Fournisseurs
Infrastructures
6 février 2025



Le syndicat mixte ouvert

Seine et Yvelines Voirie
(anciennement EPI 78-92)

Céline MAURIZE, Directrice générale
François GROS, Directeur adjoint



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Une mutualisation réussie à poursuivre

- Créé en 2016, l'EPI 78-92 (établissement public interdépartemental) hébergeait l'activité d'exploitation et d'entretien des routes départementales des Yvelines et des Hauts de Seine.
- Si chacun des départements reste maître de sa propre politique routière, le succès de cette mutualisation se mesure sur **l'optimisation des dépenses** (assiette des marchés), et la **mise en commun des ressources d'expertise** (Ouvrages d'art, Gestion des carrefours à feux avec le PC SITER)

La création d'un syndicat mixte ouvert (SMO) pour porter l'activité voirie a 2 objectifs majeurs :

- Simplifier la gouvernance
Le comité syndical sera constitué de 10 élus titulaires (et 10 suppléants) contre 88 à l'EPI.
- Ouvrir les prestations aux communes
Une offre de service sera définie courant 2025 pour les communes souhaitant adhérer au SMO. Ces prestations s'effectueront sur devis à la demande et ne constituent pas un transfert de compétence.





Création du SMO Seine et Yvelines Voirie

- Le nouvel établissement a été créé par arrêté préfectoral du 18 octobre 2024.
- Il est opérationnel depuis le 1^{er} janvier 2025.

Sur les RD des Yvelines et des Hauts-de-Seine, des missions et un patrimoine inchangés.

78

92

1576 km de RD
dont 1000 km hors agglomération

350 km de linéaire cyclable

720 ouvrages d'art

353 carrefours à feux

137 bassins et bassins enterrés

24 400 arbres d'alignements

332 km de RD
dont 8km hors agglomération

195 km de pistes cyclables

357 ouvrages d'art

717 carrefours à feux


52 bassins enterrés



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



250 agents



MARCHÉS ET ACCORDS-CADRES CONCERNANT LA VOIRIE, LES OUVRAGES ET LES EQUIPEMENTS DE LA ROUTE





Intitulé du marché et localisation	Date prévisionnelle de publication
<p>Rénovation des contrôleurs de carrefours et extensions SITER sur le réseau routier des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine :</p> <ul style="list-style-type: none"> lot 1 : carrefours situés sur les RD des Hauts-de-Seine lot 2 : carrefours situés sur les RD des Yvelines 	<p>Décembre 2024 Remise des offres le 18/02/2025</p>
<p>Travaux d'entretien et de rénovation de la couche de roulement ou de structure en matériaux hydrocarbonés sur les voies du département des Hauts-de-Seine - bail de noir (fonctionnement et investissement)</p>	<p>Février 2025</p>
<p>Travaux d'entretien, de réparations et d'amélioration des voies du domaine public et privé du département des Hauts-de-Seine - bail de blanc (fonctionnement et investissement)</p>	<p>Février 2025</p>





Intitulé du marché et localisation	Date prévisionnelle de publication
<p>Travaux de signalisation horizontale sur le domaine public et privé des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 lots géographiques : 3 secteurs dans les Yvelines et 1 pour les Hauts-de-Seine 	<p>Juin 2025</p>
<p>Travaux de signalisation verticale sur le domaine public et privé des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine</p> <ul style="list-style-type: none"> • lots 1, 2 et 3 : trois secteurs du territoire des Yvelines • lot 4 : secteur des Hauts-de-Seine • lot 5 signalisation dynamique sur l'ensemble des secteurs 	<p>Juin 2025</p>
<p>Travaux de voirie sur les routes des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Techniques spécifiques d'entretien de chaussées et d'accotements</p> <p>Lot n°1 : PATA (Point à Temps Automatique)</p> <p>Lot n°2 : pontage de fissures de chaussée</p> <p>Lot n°3 : enrobés projetés</p> <p>Lot n°4 : curage de fossés et dérasement des accotements</p> <p>Lot n°5 : enduits (<i>en cours de réflexion</i>)</p>	<p>Juin 2025</p>

Rencontre Fournisseurs Infrastructures

06 février 2025



Intitulé du marché et localisation	Date prévisionnelle de publication
Travaux d'entretien du patrimoine arboricole sur le secteur Vallée de Seine des Yvelines	Juillet 2025
Maintenance des matériels statiques des carrefours à feux sur certaines routes départementales des Hauts-de-Seine : <ul style="list-style-type: none"> lot 1 : carrefours sur la RD920, ceux situés hors agglomération et ceux situés le long du tramway T6, lot 2 : carrefours situés le long des tramways T1 et T2 	Juillet 2025
Travaux d'entretien et de réparation des ouvrages départementaux <ul style="list-style-type: none"> lot 1 : secteur nord du Département des Hauts-de-Seine lot 2 : secteur sud du Département des Hauts-de-Seine lot 3 : secteur Département des Yvelines lot 4 et lot 5 : ouvrages spéciaux (<i>en cours de réflexion</i>) 	Juillet 2025
Entretien des ouvrages annexes de voirie sur les voiries départementales des Hauts-de-Seine (ouvrages de gestion des eaux pluviales de voirie)	Septembre 2025

Rencontre Fournisseurs Infrastructures

06 février 2025





MARCHÉS ET ACCORDS-CADRES DE MAITRISE D'ŒUVRE, D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Intitulé du marché et localisation	Date prévisionnelle de publication
Inspections et diagnostics sur les ouvrages d'art départementaux et les portiques, potences et hauts mats (PPHM) situés sur les territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines	Février 2025
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la surveillance du patrimoine arboricole du Département des Yvelines	Juillet 2025
<p>Marché de prestations d'auscultation et d'études de chaussées du réseau routier des Yvelines et des Hauts-de-Seine</p> <p>Lot n° 1 : diagnostics et études de chaussées du réseau routier des Yvelines et des Hauts-de-Seine</p> <p>Lot n° 2 : mise à disposition d'un outil embarqué et prestations associées pour l'auscultation du réseau routier des 2 Départements</p>	Décembre 2025
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour un accompagnement en vue de la modernisation du PC SITER – réflexion encore en cours	Fin 2025






MARCHÉS ET ACCORDS-CADRES DE FOURNITURES

Intitulé du marché et localisation	Date prévisionnelle de publication
Fourniture de matériaux, produits techniques et d'entretien en régie de la voirie <ul style="list-style-type: none"> lot 3 : enrobés à froid hautes performances 	Mars 2025



Annexe :

Services territoriaux : unités d'entretien et d'exploitation et unités études et travaux

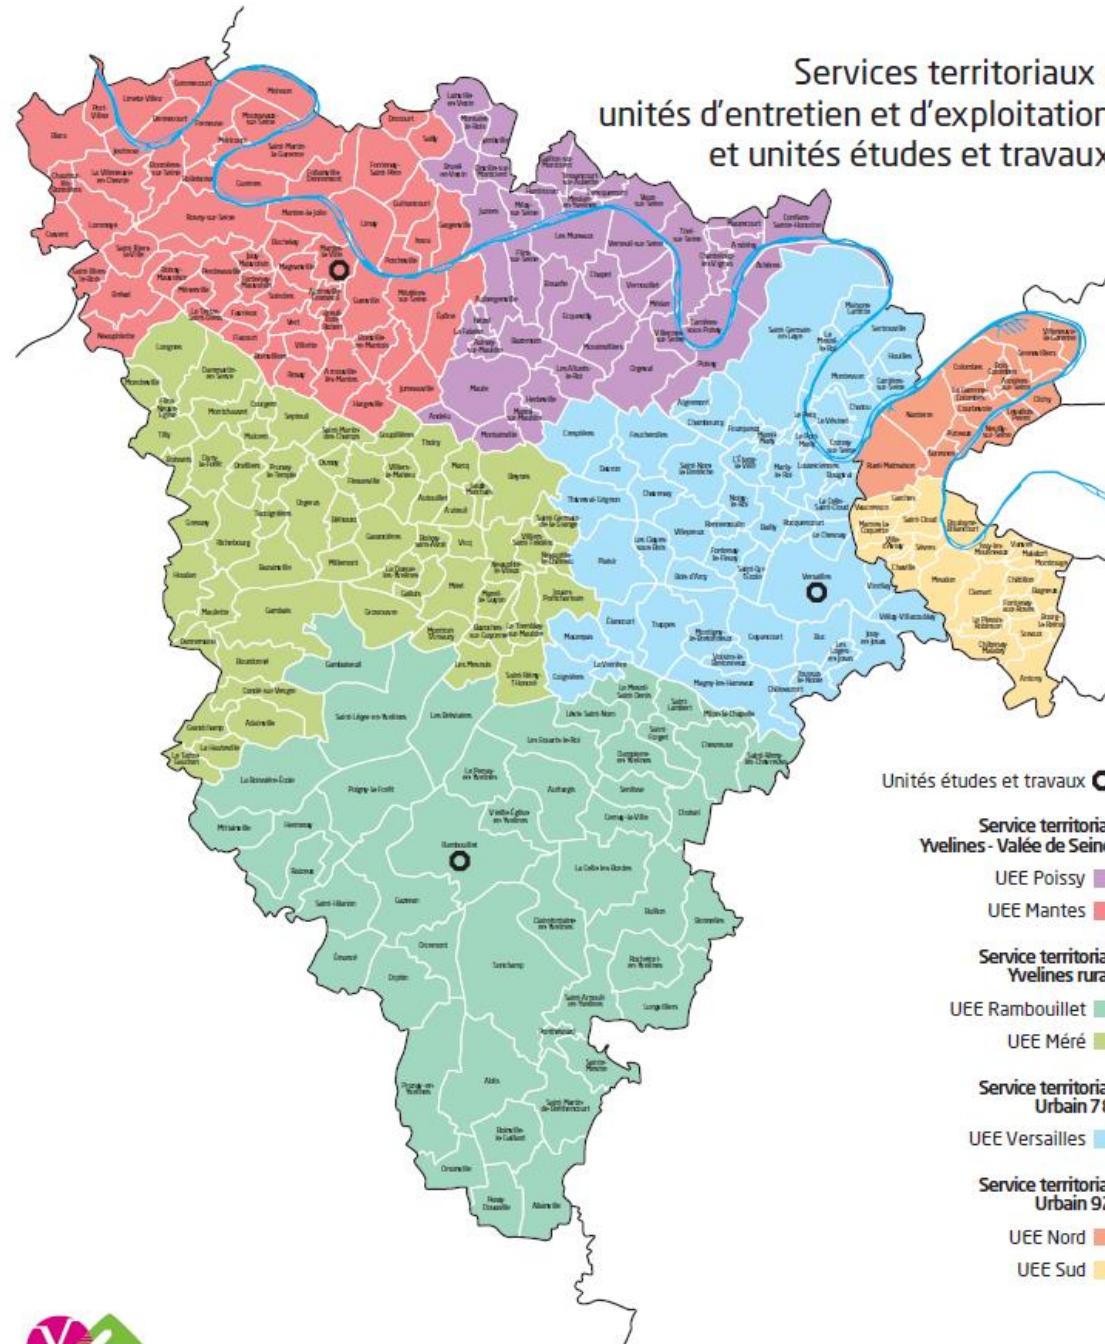



MOBILITES DEPARTEMENT DES YVELINES



Yvelines • Hauts-de-Seine

Réunion Fournisseurs
Infrastructures
6 février 2025



LES GRANDS PROJETS ROUTIERS TRAVAUX ET ETUDES A VENIR

MAITRISE D'OUVRAGE DEPARTEMENTALE



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Nouvelle liaison RD 30/ RD 190 – Pont d’Achères – Boucle de Chanteloup
**TRAVAUX : VRD section RD 190 – RD 22 à Triel-s/Seine et Carrières-s/s-Poissy
élargissement RD 190 (650 m) + section neuve (1 450 m)**

Objectifs :

- Améliorer les conditions de desserte et d’accessibilité du territoire de la Boucle de Chanteloup
- Création d’une desserte routière Est-Ouest par un franchissement de Seine


Caractéristiques : 3,4 km de Voie Nouvelle et 2,4 km de requalification. Nouveau franchissement de Seine par un pont (750 m).

Estimation opération : 160 M€ TTC

Date prévisionnelle AAPC : T2 2025

Date prévisionnelle début des prestations : T4 2025

MOE : groupement INGEROP – STRATE - OUTSIDE

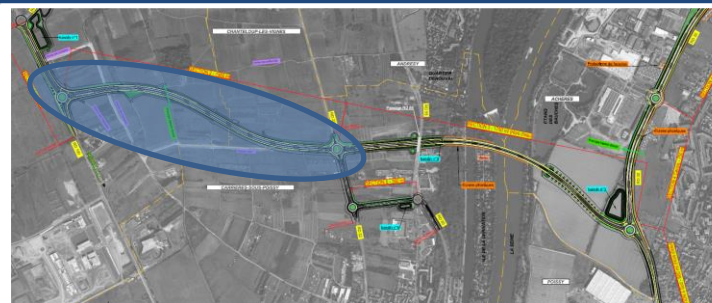

**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025





Nouvelle liaison RD 30/ RD 190 – Pont d’Achères – Boucle de Chanteloup TRAVAUX : Aménagement section RD 30 à Achères élargissement et aménagement sur place (1 400 m)

Objectifs :

- Améliorer les conditions de desserte et d’accessibilité du territoire de la Boucle de Chanteloup
- Création d’une desserte routière Est-Ouest par un franchissement de Seine


Caractéristiques : 3,4 km de Voie Nouvelle et 2,4 km de requalification. Nouveau franchissement de Seine par un pont (750 m).

Estimation opération : 160 M€ TTC

Date prévisionnelle AAPC : T3 2025

Date prévisionnelle début des prestations : T1 2026

MOE : groupement INGEROP – STRATE - OUTSIDE

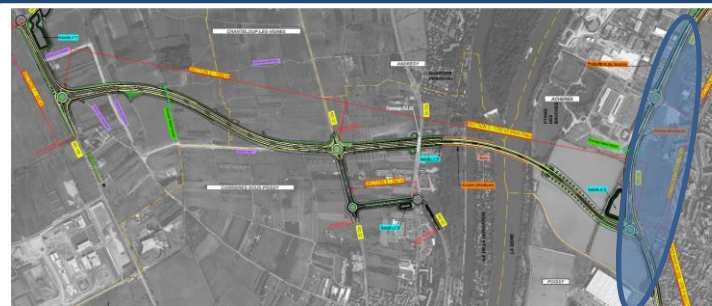

**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025






Nouvelle liaison RD 30/ RD 190 – Pont d'Achères – Boucle de Chanteloup ACCORD-CADRE : contrôle labo

- Durée prévisionnelle : 4 ans
- Date prévisionnelle AAPC : T3 2025
- Date prévisionnelle début des prestations : T1 2026

Montant indicatif
AC Labo : maxi 1 000 k€

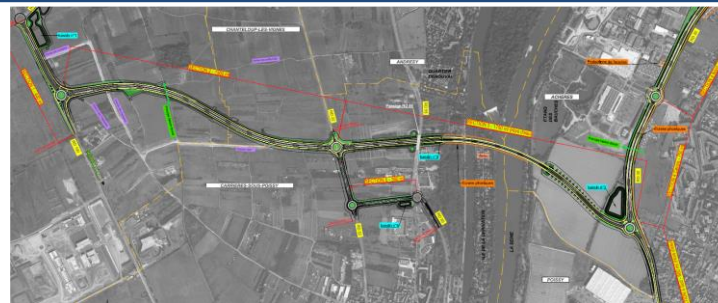




MOBILITES DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE



Yvelines • Hauts-de-Seine

Réunion Fournisseurs
Infrastructures
6 février 2025

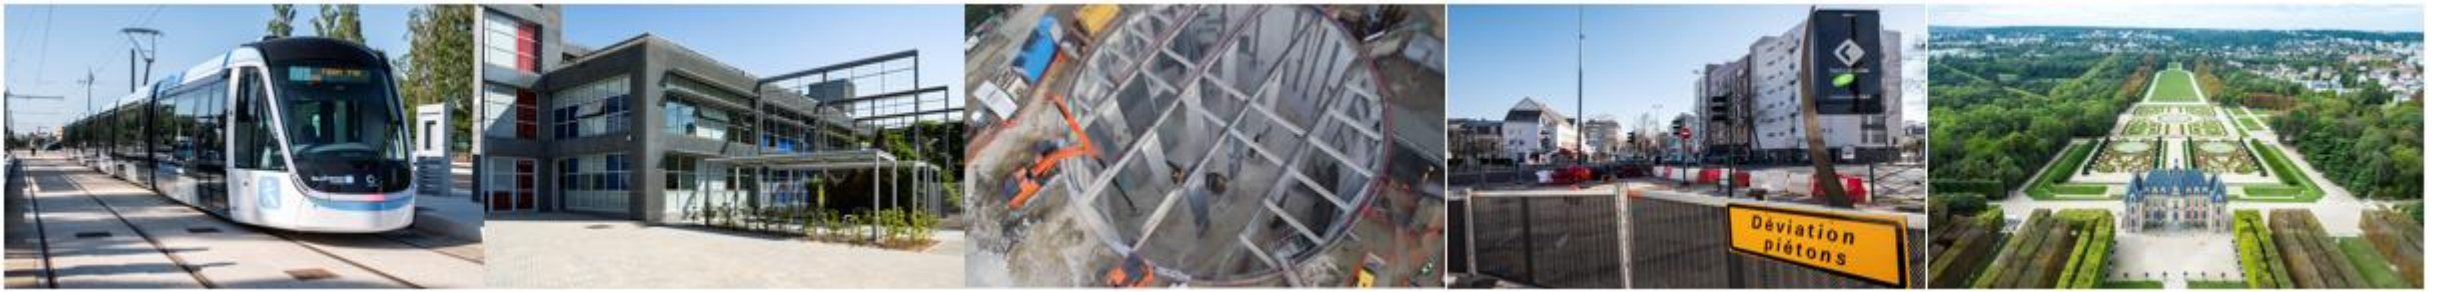

Les missions de la Direction des Mobilités

Assurer le pilotage des études et des travaux d'aménagement urbain liés aux opérations de tramways et aux opérations structurantes de voirie,
Mettre en œuvre le plan vélo départemental.

Innover et expérimenter, promouvoir les modes actifs et les nouvelles mobilités favorisant les déplacements alternatifs à la voiture,
Mieux prendre en compte les effets de la transition climatique et énergétique dans les projets de requalification de l'espace urbain.

Recueillir et traiter les données relatives à l'offre et à la demande de déplacement, étudier les priorités départementales relatives aux grandes infrastructures de transports et l'évolution de la desserte intra-départementale.
Assurer l'accessibilité et l'intermodalité autour des futures gares du GPE

▪ 310 km de routes, 195 km d'aménagements cyclables, 18 000 candélabres, 1 200 carrefours à feux et 357 ouvrages d'art
Budget 2025 :
• en investissement : 121 M€
• en fonctionnement : 122 M€





**Sous réserve des derniers arbitrages
budgétaires ...**





RD 1 - Travaux d'aménagement du quai Gorse à Boulogne-Billancourt

Allotissement et/ou particularités

- Lot 1 : Génie civil et Voirie
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore


Objet des travaux :

Aménagement du Quai Georges Gorse du Pont de Sèvres au Pont Renault avec l'insertion d'une piste bidirectionnelle et la piétonisation de la berge côté Seine.

Cet aménagement entre dans le cadre du pôle gare Pont-de-Sèvres du métro 15. Linéaire de 371 m

Contraintes locales :

Trafic important, accès au métro 15

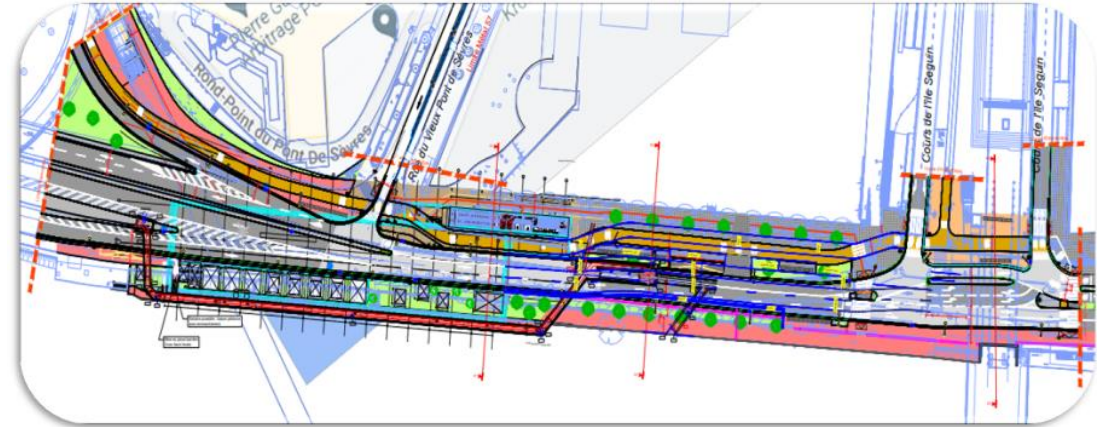

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Durée : 6 mois

Procédure de marché : MAPA





RD 1 - Travaux de réhabilitation du mur du Quai Gorse à Boulogne-Billancourt



Réhabilitation d'une portion du quai Georges Gorse face à l'île Seguin, sur la commune de Boulogne-Billancourt, en rive droite du bras de Boulogne sur la Seine, le long de la RD1.

L'opération de réhabilitation du mur du quai consiste à :

- le reconstruire en estacade sur environ 80 m ;
- réaliser l'aménagement définitif des surfaces ;
- adapter/reconstruire la murette anti-crue du système d'endiguement.

Contraintes locales :

Les travaux se réaliseront majoritairement depuis la Seine à l'abri d'un rideau de palplanches. Impact sur le chenal de navigation à prévoir.

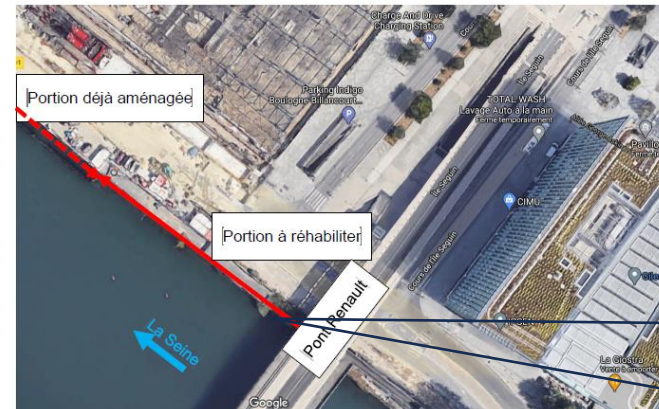


Date prévisionnelle AAPC : 03/2025

Date début prestations : été 2025

Date fin prestations : 12/2025

Procédure de marché : MAPA



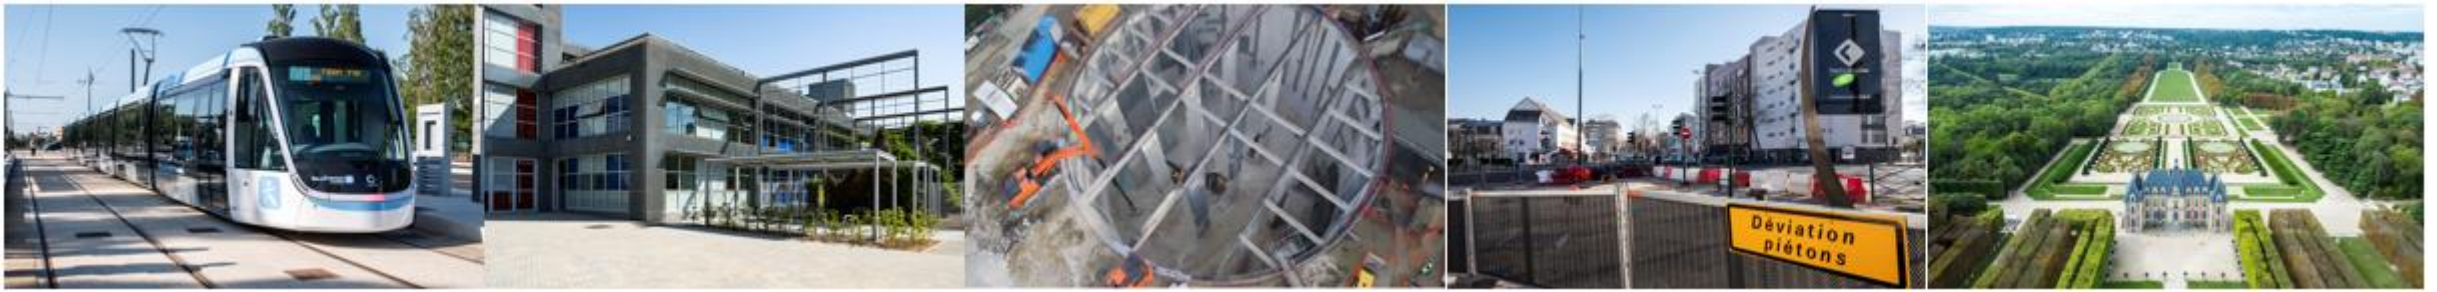

RD 1 - Travaux d'aménagement du quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt

Allotissement et/ou particularités


- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle, côté bâti, reliant les aménagements cyclables existants de Paris et du Pont d'Issy (RD 50)

Contraintes locales :

Secteur de bureaux avec les sièges des sociétés de TF1, La Française des Jeux, Huawei ...

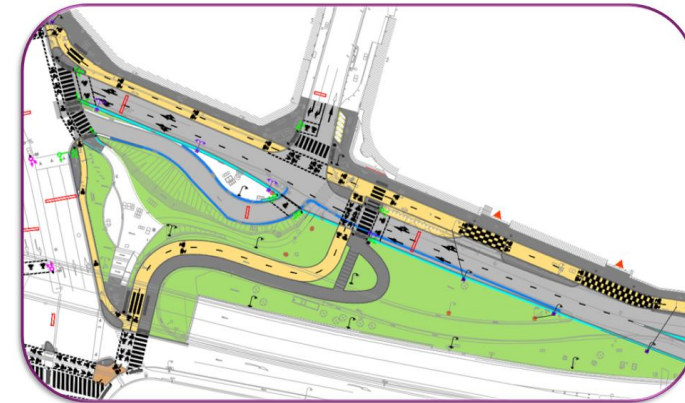


Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} semestre 2025

Date début prestations : 4^{ème} trimestre 2025

Durée : 10 mois

Procédure de marché : MAPA



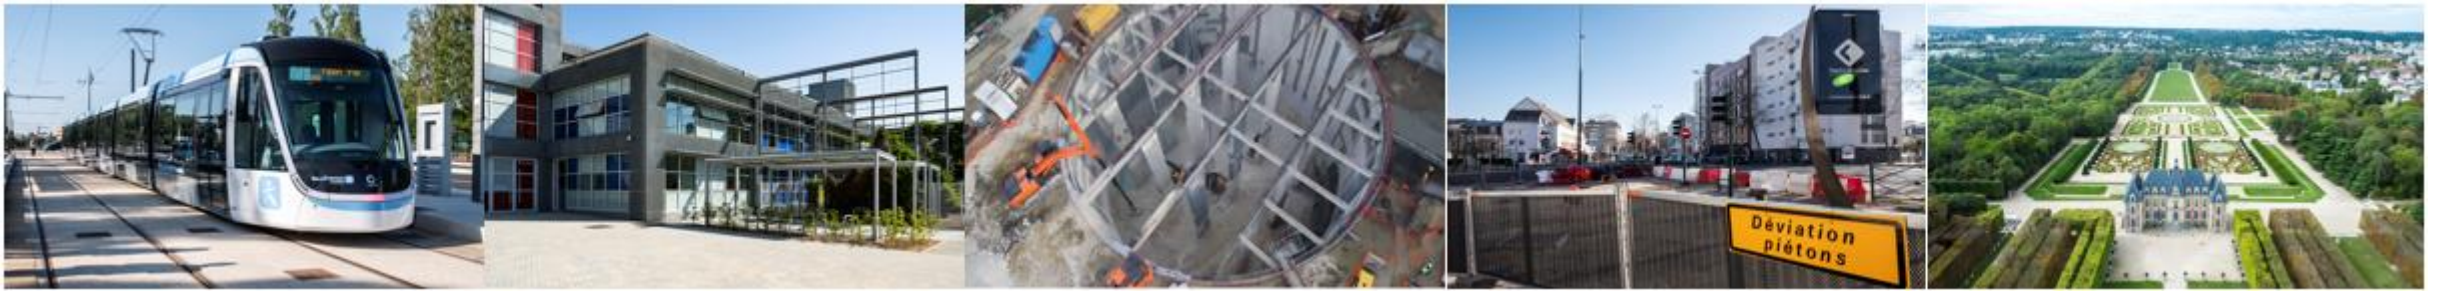

RD 2 - Travaux d'aménagement de l'avenue Claude Trébignaud à Clamart

Allotissement et/ou particularités


- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

- Création d'une voie verte (**impérativement en 2025**)
- Sécurisation d'une traversée piétonne reliant des chemins forestiers
- Réalisation de tranchées drainantes de part et d'autre de l'axe
- Rénovation du matériel d'EP/SLT

Contraintes locales :

- Lignes de bus, circulation de grumiers

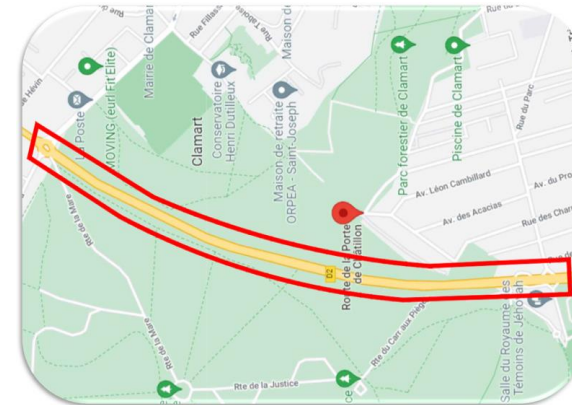

Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} semestre 2025


Date début prestations : 3^{ème} trimestre 2025

Durée : 10 mois

Procédure de marché : MAPA

**Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025**



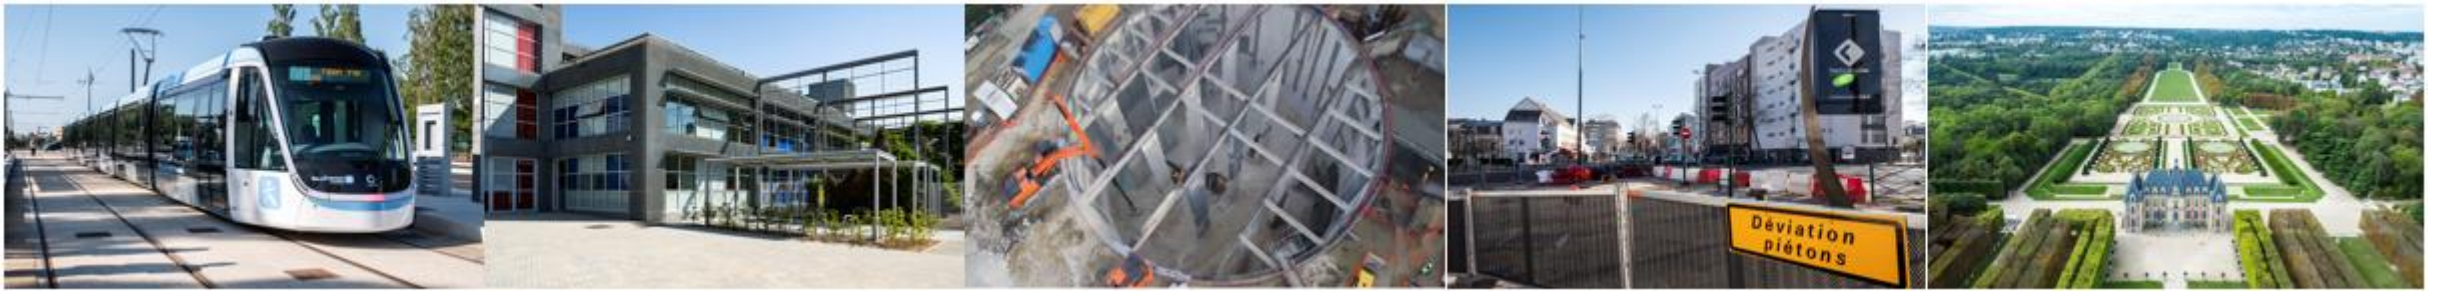

RD 7 - Travaux d'aménagement de la Place Clémenceau à St-Cloud

Réaménagement de la Place Clémenceau à Saint-Cloud : requalification de la voirie, aménagement de réseaux, démolition/création d'ouvrages d'art, végétalisation, travaux sur un pôle d'échange multimodal.

Contraintes locales :

Voie à grande circulation à l'interface entre des voies d'accès à des axes de desserte majeure (A13, D907 vers Boulogne/Paris, N118 sur RD7-Sud), avec présence d'un pôle d'échange multimodal (T2/bus) et du futur musée du Grand Siècle.

Présence d'ouvrages d'art (soutènement A13, tunnels, shunt).

Intervention partielle sur secteur classé au titre des Monuments Historiques.

Proximité de la Seine et du coteau, géotechnique.



Date prévisionnelle AAPC : 04/2025

Date début prestations : 04/2026

Date fin prestations : T4 2027

Procédure de marché : AOO





RD 7 - MOE pour le réaménagement de la RD7 à St-Cloud et Suresnes

Finalisation des études et suivi des travaux : prise en main des études existantes, reprise du PRO, DCE/ACT, VISA, DET, AOR.

Contraintes locales :

Voie à grande circulation à entre les ponts de Suresnes et St-Cloud. Nombreuses thématiques liées à la loi sur l'Eau (murettes, déblais/remblais...), à la voirie (réseaux, qualité de réalisation, durabilité) et à l'environnement (travaux sur les berges, renaturation...).

Projet sur longue durée.

Fort trafic routier, faible multimodalité et présence de péniches.

Linéaire important en milieu urbain dense (3,3km).

Nombreuses compétences nécessaires : urbanisme/architecture, réseaux, règlementaire, suivi travaux complexes...



Date prévisionnelle AAPC : S2 2025

Date début prestations : T3 2026

Date fin prestations : 2031

Procédure de marché : AOO





RD 17 - MOE pour la création de l'Avenue de la Liberté à Clichy et St-Ouen

Création d'une avenue entre la place Roguet (Clichy, 92) et la rue Galien (Saint-Ouen, 93).

CD92 MOA unique.

Le réaménagement urbain vise à renforcer la liaison entre ces deux communes, en mettant l'accent sur :

- l'amélioration de l'accessibilité,
- la promotion de la mobilité durable,
- une meilleure intégration paysagère.

Contraintes locales :

Projet situé sur des friches industrielles dégradées et polluées, incluant une ancienne casse automobile ainsi qu'un dépôt pétrolier. Implique de nombreux partenaires, notamment la Préfecture des Hauts-de-Seine, la ville de Clichy, Plaine Commune et divers promoteurs immobiliers.




Date prévisionnelle AAPC : 02/2025

Date début prestations : 09/2025

Date fin prestations : T1 2029

Procédure de marché : procédure avec négociation



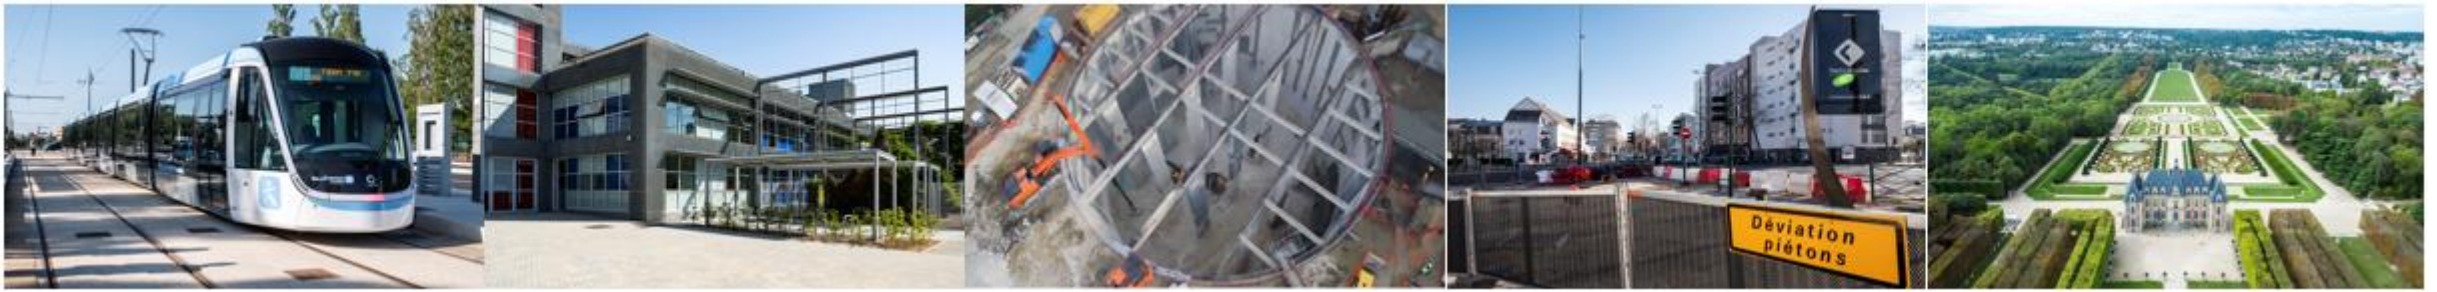

RD 20 - Travaux d'aménagement de la rue Louis Roche à Gennevilliers

Allotissement et/ou particularités

- Lot 1 : Génie civil et Voirie
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Pérennisation des coronapistes avec l'aménagement de pistes unidirectionnelles bilatérales contigües à la RD20 et sécurisation des traversées cycles/piétons aux carrefours.

Linéaire de 1,9 km

Contraintes locales :

Lignes de bus, trafic Poids lourds




Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Durée : 12 mois

Procédure de marché : procédure négociée



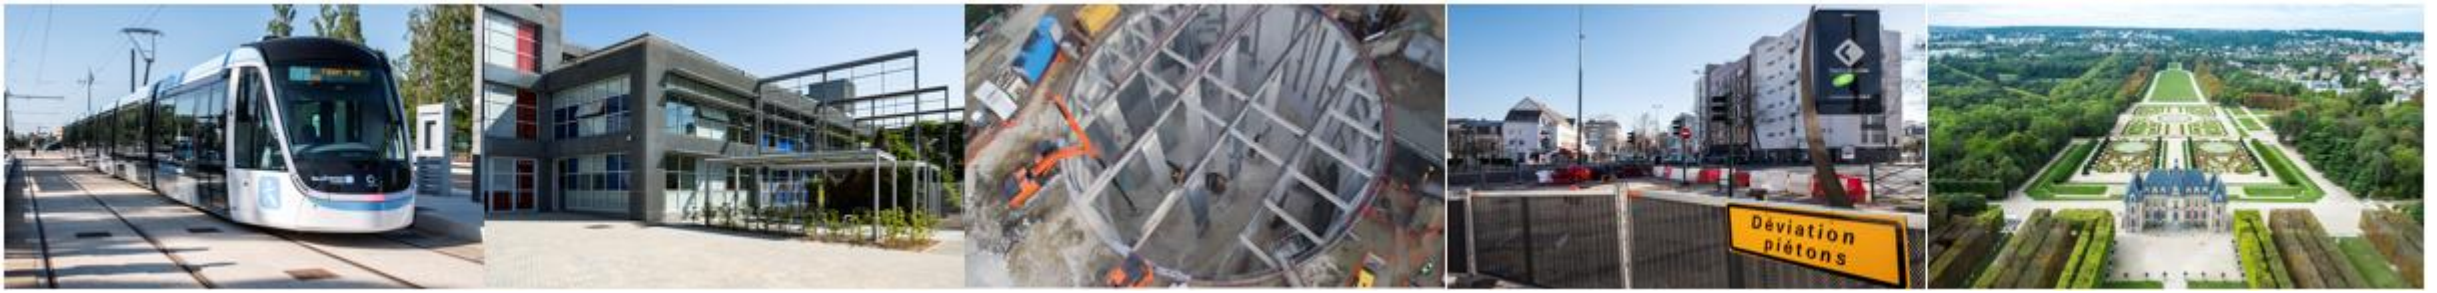

RD 39 - MOE pour la requalification des Bd Stell, Solférino et Richelieu à Rueil-Malmaison

Le projet de réaménagement la RD 39 s'étend du croisement avec la RD913 jusqu'à la rue de Gènes à Rueil-Malmaison, sur un linéaire de 1,3 km. Cet aménagement se raccordera sur le prolongement du tramway T1. Les objectifs sont :

- diminution des espaces attribués aux véhicules motorisés ;
- création d'une contre-allée ;
- création de pistes cyclables ;
- réaménagement des trottoirs ;
- renforcement des alignements d'arbres et des espaces paysagers ;
- phasage des travaux à réaliser avec maintien de circulation 2x1 voie.



Date prévisionnelle AAPC : T2 2025

Date début prestations : T4 2025

Date fin prestations : fin 2029

Procédure de marché : procédure avec négociation





RD 62 - Aménagement de l'avenue Marx Dormoy à Bagneux (phase 1)

Allotissement et/ou particularités

- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore


Objet des travaux :

Requalification de la RD 62 entre le pôle gare de Chatillon Montrouge et la rue Maurice Arnoux

Linéaire de 370 m

Contraintes locales :

Technicentre SNCF de Montrouge, nouvelle gare GPE ligne 15, ligne de bus à maintenir

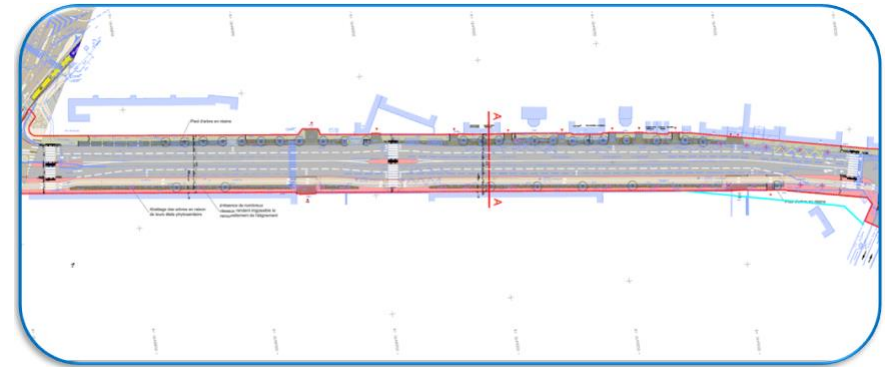


Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Durée : 10 mois

Procédure de marché : MAPA



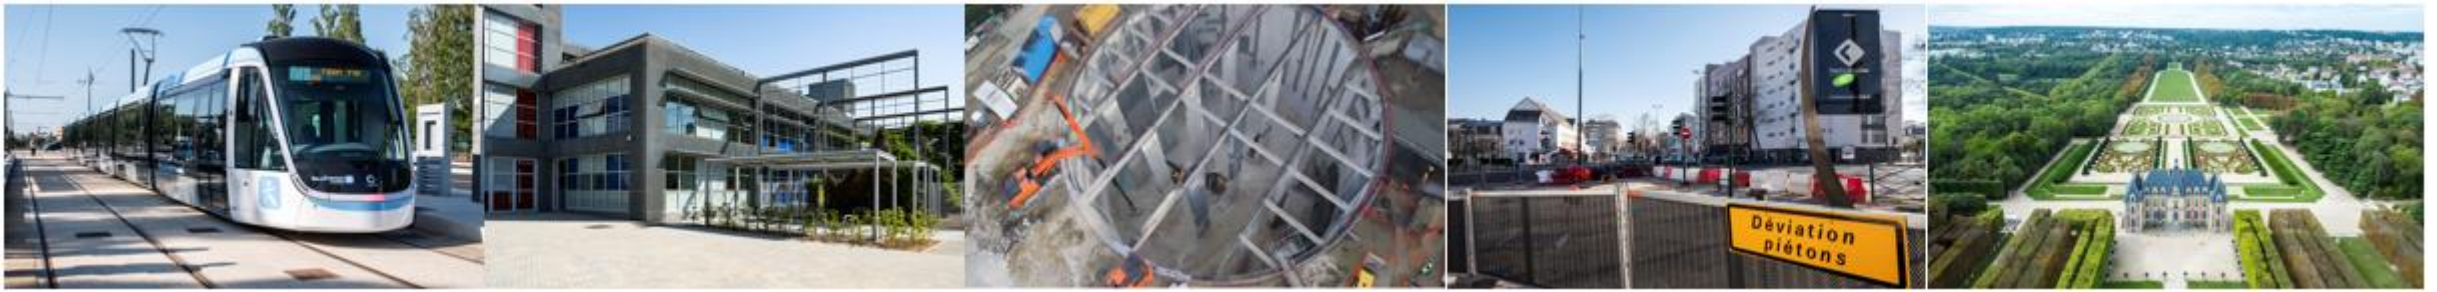

RD 63 - Travaux d'aménagement de l'avenue Jules Guesde à Sceaux

Objet des travaux :

Réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle entre le carrefour RD 50 et le carrefour des Mouilleboeufs (inclus = 580 ml)

Contraintes locales :

Interfaces avec Pôle gare RER Robinson, des projets immobiliers et artisanale. Sur 4 communes Chatenay Malabry, Sceaux, Le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses.



Date prévisionnelle AAPC : 4^{ème} trimestre 2025


Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Durée : 10 mois

Procédure de marché : MAPA

Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025



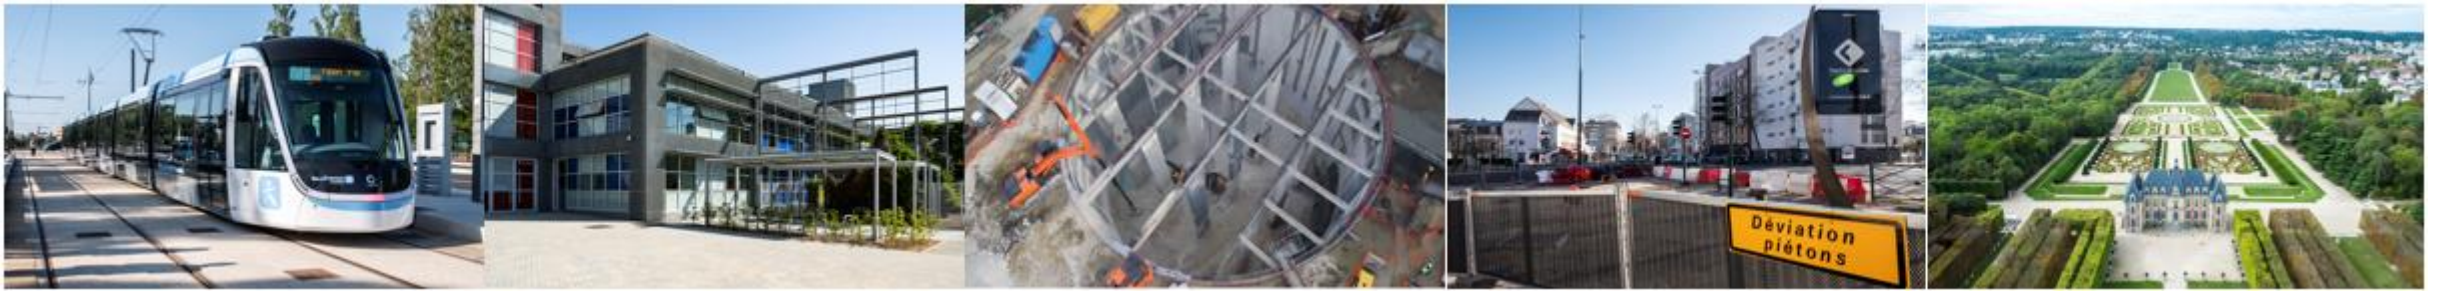

RD 67 - Avenue Sully Prudhomme à Sceaux et Chatenay-Malabry (2^{ème} phase)

Allotissement et/ou particularités :

- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Réaménagement du carrefour avec la rue Paul Couderc et de l'avenue Sully Prudhomme jusqu'au rond point Bergneustadt
Linéaire de 360 m

Contraintes locales :

Proximité du Parc de Sceaux




Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} semestre 2025

Date début prestations : 3^{ème} trimestre 2025

Durée : 10 mois

Procédure de marché : MAPA



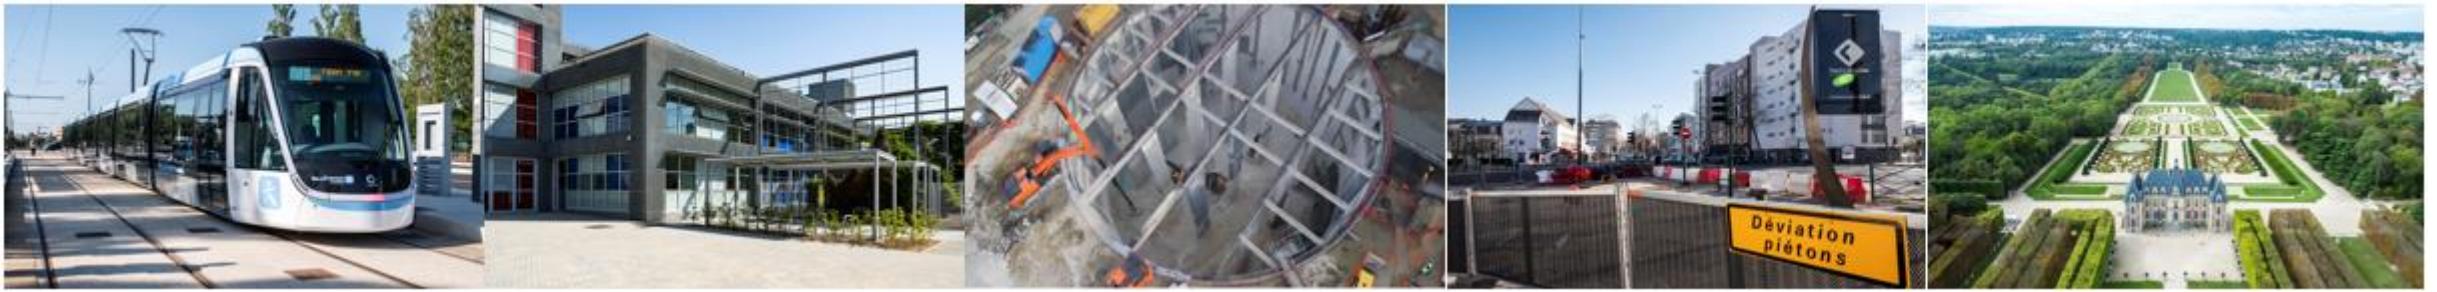

RD 67A - Travaux de réaménagement de la rue Adolphe Pajeaud à Antony

Allotissement :

- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Réaménagement de la rue Adolphe Pajeaud entre la rue des Garennes et Villa Yvonne (Antony)

Contraintes locales : Proximité de 2 établissements scolaires (Collège Anne Frank et école élémentaire Adolphe Pajeaud)
Présence de lignes de bus (RATP)



Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Durée : 12 mois

Procédure de marché : MAPA

**Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025**





RD 77a - Travaux d'aménagement de l'avenue Gabriel Péri à Bagneux

Allotissement et/ou particularités :


- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Réaménagement de l'avenue Gabriel Péri et de l'avenue Henri Barbusse (de la rue froide à la rue Marc Sangnier)
Linéaire de 650 m

Contraintes locales :

lignes de bus, commerces, établissements scolaires (maternelle, élémentaire et un lycée)

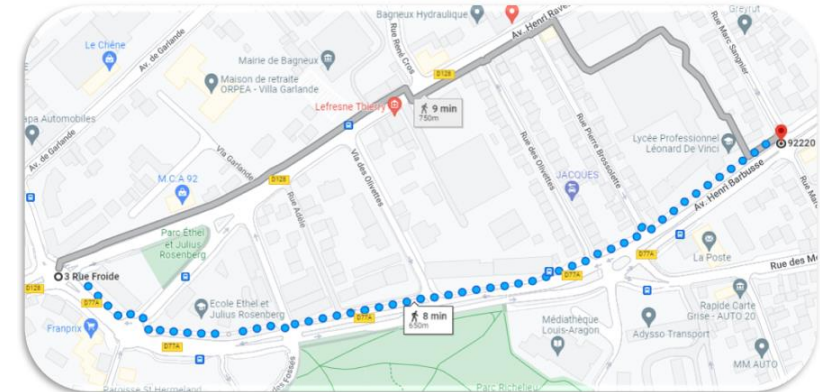

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025


Date début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Durée : 12 mois

Procédure de marché : MAPA

**Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025**



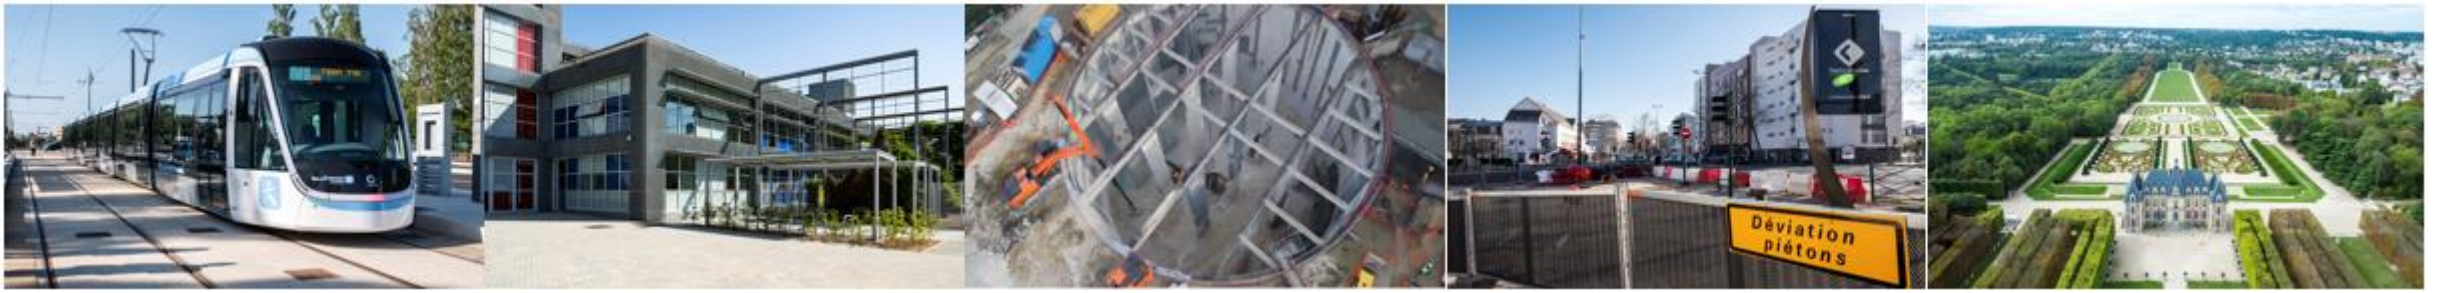

RD 907 – MOE pour l'aménagement de la route de la reine à Boulogne-Billancourt

Le projet consiste à réaliser une piste bidirectionnelle côté sud en déplaçant le stationnement, entre le pont de St-Cloud et Paris. Une renaturation des sols est recherchée entre les pieds d'arbres existants.

Adaptation du profil de la voirie suivant les tronçons

Objectifs travaux début 2027




Date prévisionnelle AAPC : 1er semestre 2025.

Début des prestations : 4ème trimestre 2025

Procédure de marché : procédure avec négociation

**Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025**



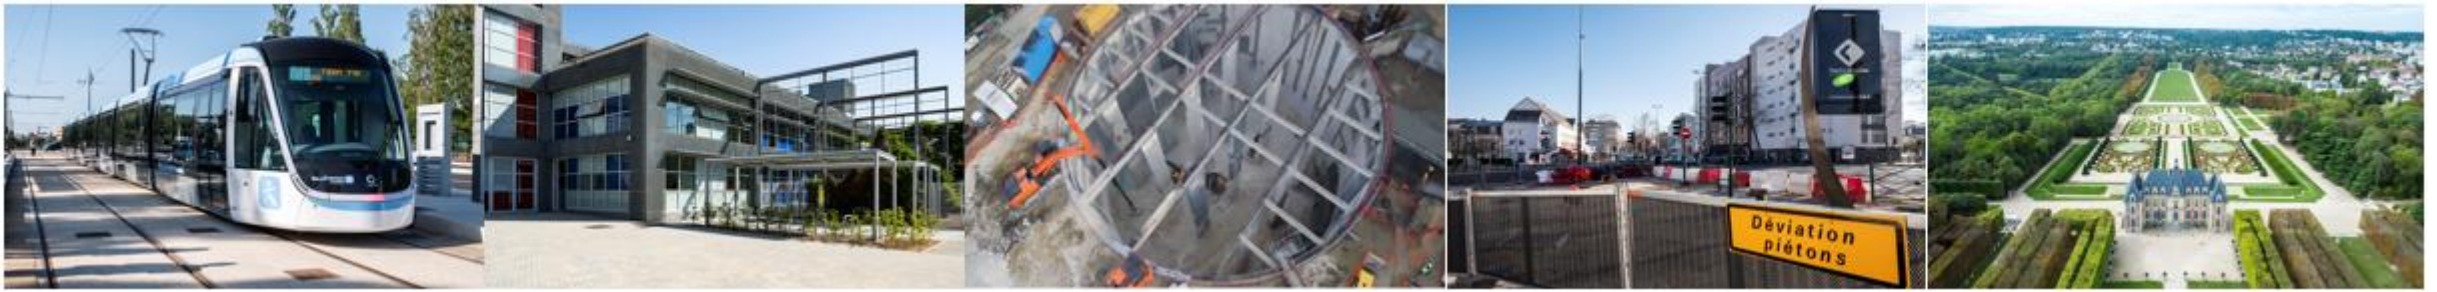

RD 907 - Travaux d'aménagement du boulevard de la République à Marnes-la-Coquette et Vaucresson

Allotissement et/ou particularités

- Lot 1 : Génie civil et Voirie
- Lot 2 : EP/SLT

Désamiantage à prévoir au démarrage

Chantier bas carbone (engins électriques, recyclage)

Objet des travaux :

Requalification complète du boulevard de la République (RD 907) à Vaucresson, Marnes-la-Coquette et Garches
Linéaire d'1 km

Contraintes locales :

Pavillons à Marnes-la-Coquette, établissements scolaires à Vaucresson et Marnes-la-Coquette, lycée élèves handicapés à Garches



Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Durée : 12 mois

Procédure de marché : MAPA

Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025





RD 908 - MOE pour l'aménagement du Boulevard de Verdun à Courbevoie

Le projet consiste à réaménager le boulevard entre la rue latérale et le rond-point de l'Europe, de façade à façade sur une longueur de 400 mètres environ.

Contraintes locales :

Coordination avec une opération d'aménagement urbain (Village Delage)



Date prévisionnelle AAPC : S1 2025

Date début prestations : 2026

Date fin prestations : 2032

Procédure de marché : procédure avec négociation





RD 909 - Travaux d'aménagement de la passerelle d'Asnières-Clichy

Allotissement et/ou particularités

- Géotechnique/ Fondations
- Charpente
- Génie Civil

Objet des travaux :

Création d'une passerelle suspendue, piétonne et cycliste, de 200 mètres de long et 6 m de large entre Asnières-sur-Seine et Clichy-la-Garenne

Contraintes locales :

Contexte naturel abords de la Seine, activités commerciale Rosa Bonheur.




Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Durée : 20 mois

Procédure de marché : AOO



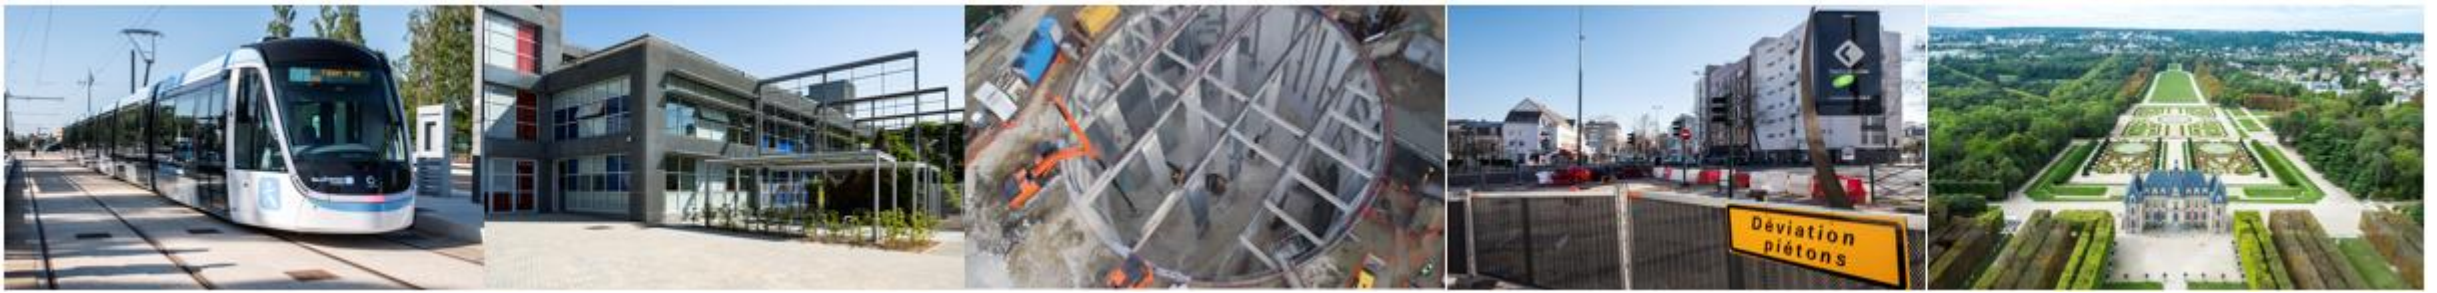

RD 910 - Travaux de réaménagement de l'échangeur de la Manufacture de Sèvres

Transformation d'un échangeur routier en carrefour urbain : meilleure lisibilité des liaisons, insertions d'aménagements pour les cycles et piétons, carrefours à niveau à feux.

Démolitions des ouvrages : viaduc, PSGN.

Aménagement de 2 ronds-points à feux tricolores.

Mise en valeur paysagère des sites historiques de la manufacture de Sèvres (espaces verts et éclairage).

Contraintes locales :


Carrefour névralgique : Tramway T2 / N118

Circulation intense, lignes de bus

Périmètre ABF (musée de la Céramique, Parc de St Cloud)

Allotissement :

lot OA, lot Voirie, lot EP/SLT et lot EV

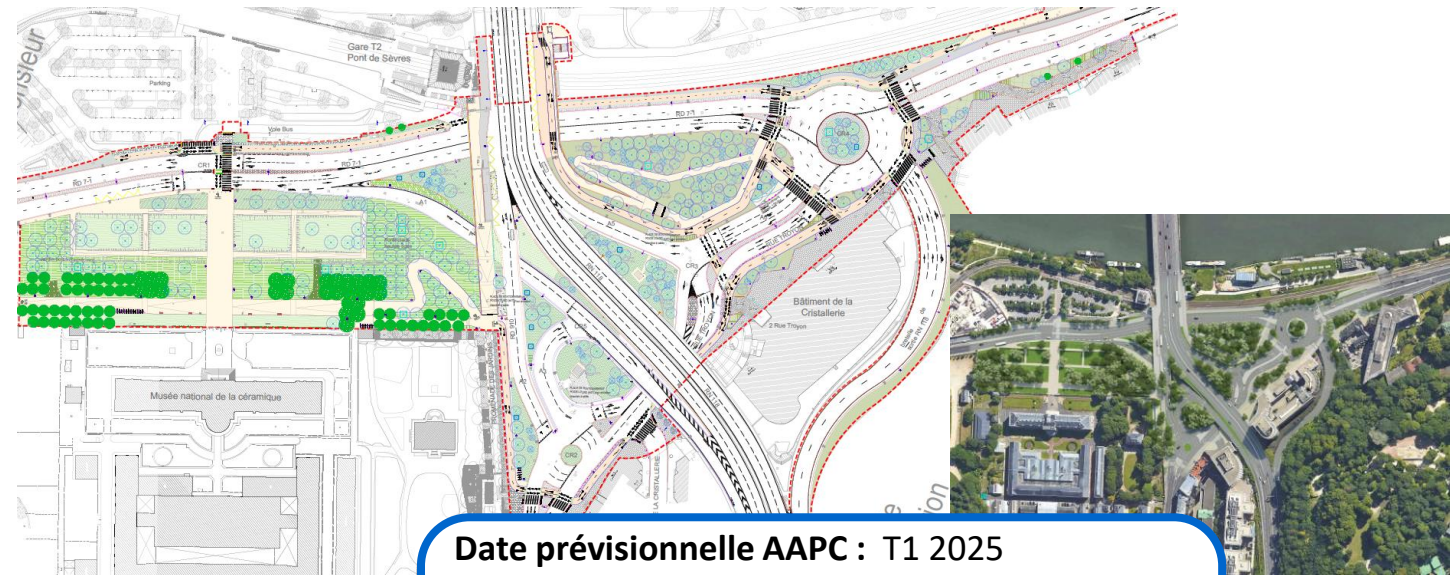

Date prévisionnelle AAPC : T1 2025

Date début prestations : 08/2025

Date fin prestations : 10/2029

Procédure de marché : AOO





RD 910 - Travaux de réaménagement de la Voie Royale à Sèvres et Chaville

Le projet de réaménagement la RD 910 s'étend du croisement avec la RD406 à Sèvres jusqu'à la limite des Yvelines à Chaville, sur un linéaire de 3,8 km. Cet aménagement viendra en prolongement de celui réalisé sur l'échangeur de la manufacture.

Contraintes locales :

Espace de voirie contraint, 2 cœurs de ville traversés

Allotissement :

Lot Voirie, lot EP/SLT et lot EV.




Date prévisionnelle AAPC : T2 2025

Date début prestations : T1 2026

Date fin prestations : 2030

Procédure de marché : AOO



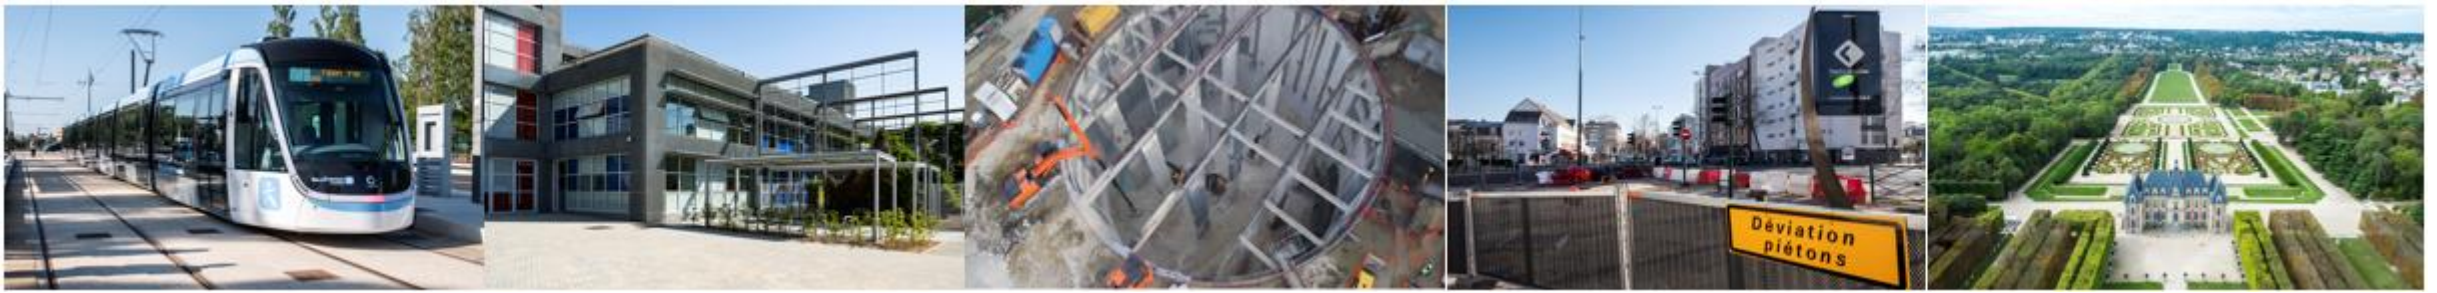

RD 911 - Travaux d'aménagement du boulevard Jean Jaurès à Clichy

Allotissement et/ou particularités


- Lot 1 : Génie civil et Voirie
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Aménagement d'une piste unidirectionnelle entre Paris et le Pont de Clichy . La piste de 2,5 m de largeur sera séparée de la chaussée par une bande d'espace vert plantée.

Contraintes locales :

Centre ville de Clichy, commerces et plusieurs lignes de Bus (54, 174, 274, 341, TUC Est TUC Ouest, N15, N 51)

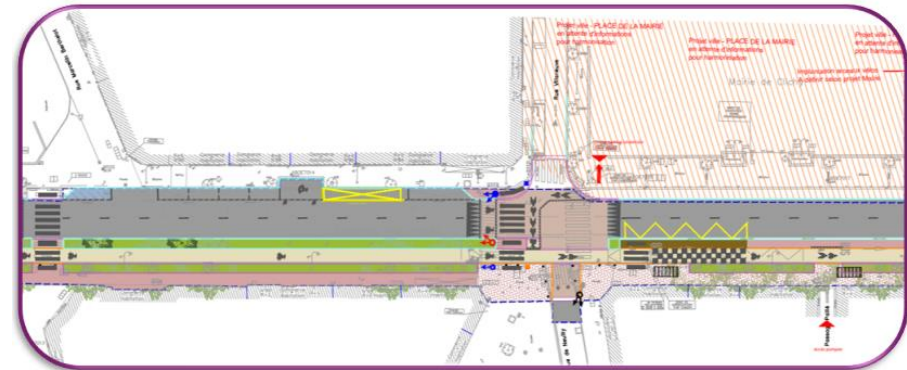

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Procédure de marché : MAPA






RD 920 - MOE pour le réaménagement de la voirie à Montrouge

Requalification de l'ancienne nationale 20 sur le périmètre de la commune de Montrouge (env. 1,1km) :

- diminution des espaces attribués aux véhicules motorisés ;
- création d'une contre-allée ;
- création de pistes cyclables aux standards VIF ;
- réaménagement des trottoirs ;
- reprises des alignements d'arbres et des espaces paysagers.

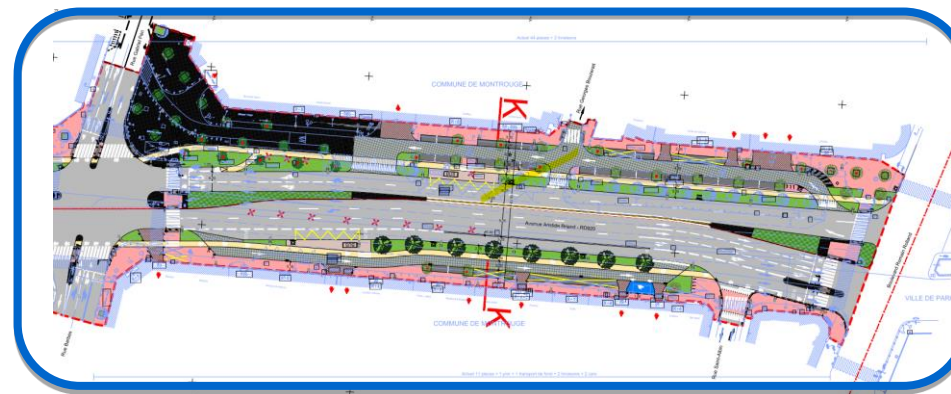

Date prévisionnelle AAPC : mi-2025

Date début prestations : S1 2026

Date fin prestations : 2030

Procédure de marché : procédure avec négociation





RD 920 - MOE pour le réaménagement de la place de la Résistance à Bourg-la-Reine

Requalification de la place de la Résistance et du tronçon de la RD920 au nord de celle-ci (env. 225m au total) :

- diminution des espaces attribués aux véhicules motorisés ;
- création d'une placette accessible ;
- création de pistes cyclables aux standards VIF ;
- réaménagement des trottoirs.




Date prévisionnelle AAPC : T3 2025

Date début prestations : S1 2026

Date fin prestations : 2030

Procédure de marché : procédure avec négociation



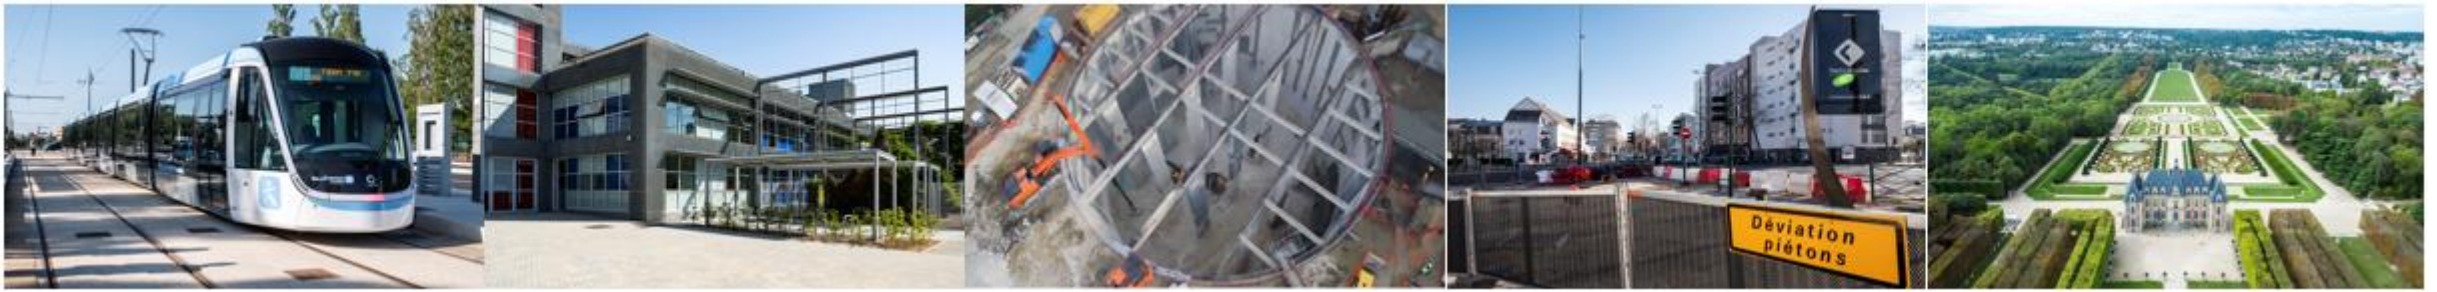

RD 991 - Travaux d'aménagement de l'avenue de Colmar à Rueil-Malmaison

Allotissement et/ou particularités


- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Objet des travaux :

Insertion d'une piste cyclable sur l'ave Colmar à Rueil-Malmaison RD991 sur 1,3km

Contraintes locales :

Trafic et nombreuses lignes de bus, affluences au heures de pointes vers le Mobipôle, stationnement 2 roues motorisés, commerces contraintes livraison.

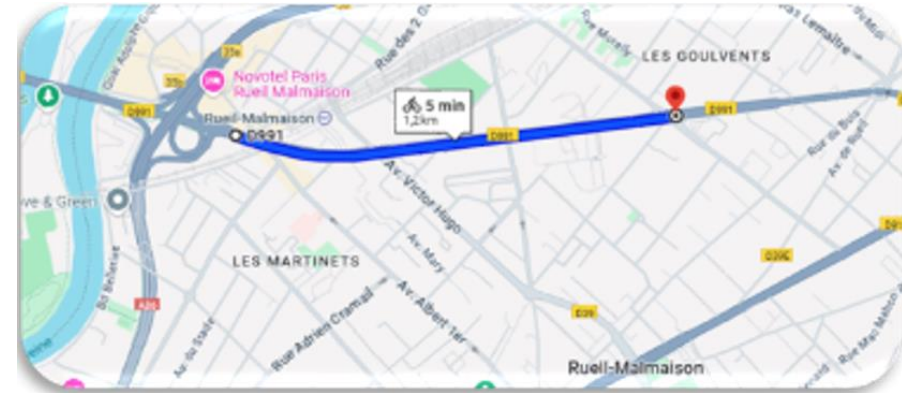

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Procédure de marché : MAPA





Pôle gare Chatillon-Montrouge (travaux)

Allotissement et/ou particularités

- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore

Découpage géographique par RD

Désamiantage à prévoir au démarrage (RD906 et RD63)

Objet des travaux :

Aménagement des voiries départementales RD62, RD63, RD63A et RD906 du pôle gare Châtillon-Montrouge

Contraintes locales :

Interface travaux avec le projet immobilier de la SGP, lignes de bus, circulation piétonne importante, ouverture de la ligne 15



Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} semestre 2025

Date début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Date fin prestations : 1^{er} trimestre 2028

Durée : 24 mois

Procédure de marché : MAPA

**Rencontre Fournisseurs Infrastructures
06 février 2025**





ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'OEUVRE

Deux lots :

- Lot n°1 : opérations de requalifications de voirie et d'aménagements cyclables, pour des opérations de travaux d'un montant inférieur à 10 M€ HT.
Accord cadre multi-attributaires (3 maximum), avec un maximum annuel de 1,500 M€ HT, sur marchés subséquents.
- Lot n° 2 : opérations d'aménagements localisés de la voirie et d'équipements accessoires, pour des opérations d'un montant inférieur à 1 M€ HT.
Accord cadre mono-attributaire, avec un maximum annuel de 500 k€ HT, sur bons de commande.



Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} trimestre 2025.

Durée du marché : 4 ans

Procédure : AAO





ACCORD-CADRE D'AMO MESURES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Objet du marché

Mesures environnementales (air, bruit, vibration, inventaires faunes-flores)

Études d'impacts air, bruit, vibration, eau, socio-économiques

Dossiers réglementaires

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, avec un maximum annuel de 1,2 M€ HT par période de 2 ans.




Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025.

Durée du marché : 4 ans

Procédure : AAO



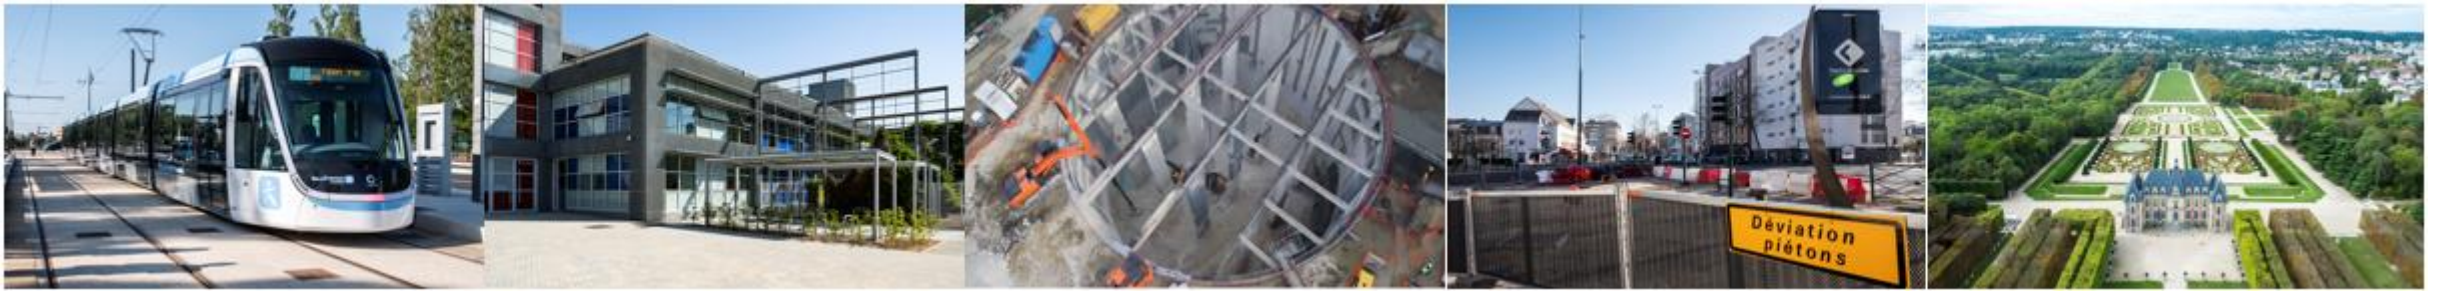

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

Accord-cadre pour réaliser les travaux de voirie entre 500 k€ et 10 M€ HT.

Allotissement :

- Lot 1 : Génie civil et matériaux bitumineux
- Lot 2 : Éclairage public – Signalisation lumineuse tricolore

Accord-cadre multi-attributaires avec un maximum annuel fixé à 40 M€ HT, sur bons de commande ou marchés subséquents selon le montant de l'opération.

Les travaux pourront couvrir à la fois le génie civil, les matériaux bitumineux, l'éclairage, la signalisation lumineuse tricolore, de la dépose, fourniture et pose de mobiliers urbains, la réalisation des fosses d'arbres, l'amenée de la terre végétale ...



Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2025

Date début prestations : 4ème trimestre 2025

Durée du marché : 4 ans

Procédure de marché : AOO





Direction de la Nature et des Paysages

Eric Goulouzelle, Directeur



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Qui sommes-nous ?

Missions

- Aménagement et préservation des espaces verts
- Gestion des arbres le long des routes départementales
- Création de promenades vertes
- Accueil du public et surveillance des parcs

Stratégie Nature : Plan d'actions 2021-25

- Créer 5 km de liaisons vertes
- Ouvrir au public 20 ha d'ENS en plus
- Rénover 60 ha d'ENS
- Planter 19 000 arbres supplémentaires
- Installer 50 nouveaux potagers dans les collèges

Quelques chiffres

- 28 parcs, jardins, bois et promenades ouverts au public, soit **620 ha**
- **22 sites labellisés Eve®** (Espace végétal écologique)
- 11 ha de surface revalorisée par an
- **30 000** arbres d'alignement sur RD
- 4 000 arbres plantés par an sur parcs et RD
- **16 millions** de visiteurs par an

Budget 2025 :


15 M€ en investissement
13 M€ en fonctionnement





Nouvelle Stratégie Nature 2026-2030 : Ouverture de nouveaux parcs

**Jardin de l'Île Seguin,
Boulogne-Billancourt**

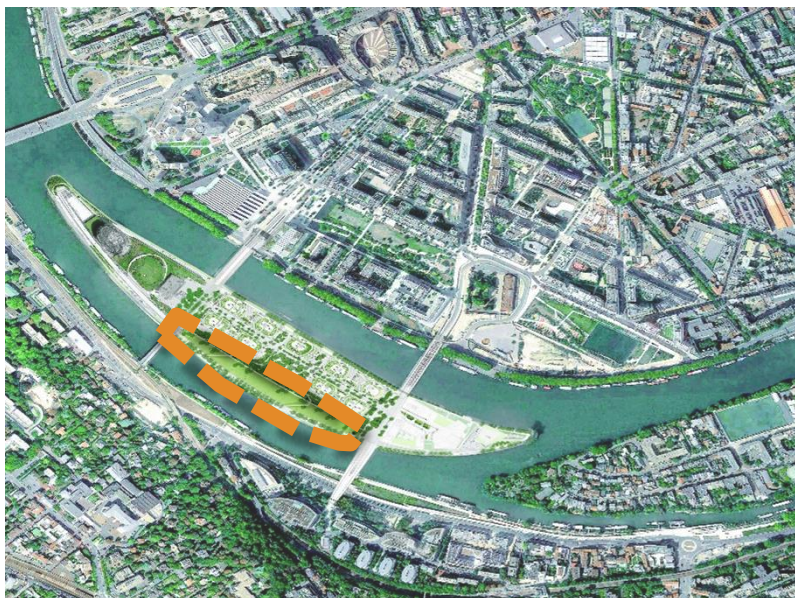

**Extensions du parc du
Chemin de l'Île, Nanterre**



**Parc de la Roseraie,
Châtenay-Malabry**





Nouvelle Stratégie Nature 2026-2030 : Maintien de la qualité d'entretien des parcs





Nouvelle Stratégie Nature 2026-2030 : Plantation de 30 000 arbres





Nouvelle Stratégie Nature 2026-2030 : Une démarche de protection accrue des arbres (Guide de l'Arbre)





Nouvelle Stratégie Nature 2026-2030 : Déploiement de parcs autonomes



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Procédures marchés publics à lancer en 2025



Yvelines • Hauts-de-Seine

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025



Parc du Chemin de l'île à Nanterre : Aménagement du Jardin des Papeteries





Parc du Chemin de l'île à Nanterre : Aménagement du Jardin des Papeteries

Objet : Aménagement de l'ancien site de la **Papeterie de la Seine** sur 2,1 ha. Cette extension sera dévolue à un usage pour la biodiversité par la création notamment d'une mare de 400 m², de prairies 8500 m², 1800 m² de masse arbustive et la reconstitution 6 000 m² de boisement, 280 m de clôtures.

Allotissement :

Lot 1 : Terrassement-VRD- Génie civil

Lot 2 : Espaces verts

Lot 3 : Clôtures

Procédure : Adaptée

Contraintes particulières : Label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- **Publicité (AAPC) : 2^{ème} trimestre 2025**
- **Début des travaux : Automne 2025**
- **Durée des prestations : 11 mois**



© CD92


**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025





Réaménagement de l'esplanade du château du Domaine de Sceaux

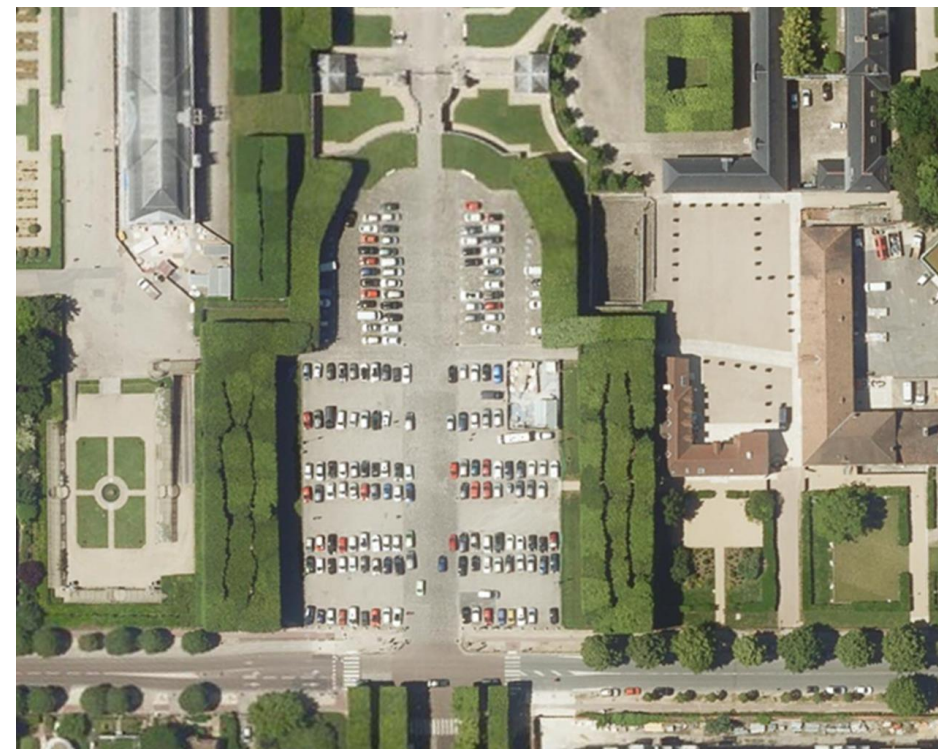



Réaménagement de l'esplanade du château du Domaine de Sceaux

Objet : Revaloriser l'axe historique de l'allée d'honneur ; Optimiser le stationnement et les circulations ; Permettre l'accessibilité PMR ; Favoriser l'infiltration des eaux pluviales.

Travaux : réhabilitation des réseaux d'assainissement, aménagement de structures réservoirs, dévoiement de réseaux, assises des revêtements de surface, pavage et bétons paysagers, mobilier et éclairage.

Surface : 1,2 ha

Allotissement : 2 lots. Lot 1 : VRD, Lot 2 : électricité / éclairage

Spécificités : abords de MH, Site classé, Jardin remarquable, Label Eve®

MOE : Externe pour phase études (2BDM) ; Interne pour phase chantier

Calendrier prévisionnel :

- Publicité : février 2025
- Début des travaux : 3^e trimestre 2025
- Durée des prestations : 11 mois

Procédure : Adaptée





Parc de la Folie Sainte-James : travaux de mise en conformité de l'étanchéité du bassin haut du Grand Rocher





Parc de la Folie Sainte-James : travaux de mise en conformité de l'étanchéité du bassin haut du Grand Rocher

Objet : Reprise de l'étanchéité du **parvis**, du **bassin** et de la **fontainerie** sur la partie supérieure du Grand Rocher :

- Reprise aux normes des canalisations de la fontainerie
- Reprise des désordres de l'étanchéité

Allotissement :

Lot 1 : reprise de l'étanchéité

Lot 2 : reprise de la fontainerie

Procédure : Adaptée

Contraintes particulières : classement **MH**

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : avril 2025
- Début des travaux : septembre 2025
- Durée des prestations : 6 mois



© CD92

**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025





Conception et suivi de la réalisation d'une nouvelle signalétique et d'un nouveau mobilier spécifique au Domaine de Sceaux





Conception et suivi de la réalisation d'une nouvelle signalétique et d'un nouveau mobilier spécifique au Domaine de Sceaux

Objet :

Marché de **maîtrise d'œuvre** (avec MOE designer) pour la conception d'une nouvelle signalétique (y compris le mobilier) intégrant la **nouvelle charte** du Domaine de Sceaux.

Procédure : adaptée

Contraintes particulières :

- Label Eve®
- Site classé (validation par un Architecte des Infrastructures de France et un inspecteur des sites)

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : juin 2025
- Début des prestations : novembre 2025
- Durée prévisionnelle : 4 ans



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Réfection des réseaux primaires d'arrosage et stations de pompage avec mise en place d'une GTC sur 4 parcs





Réfection des réseaux primaires d'arrosage et stations de pompage avec mise en place d'une GTC sur 4 parcs

Objet :

Travaux de réfection des **réseaux primaires d'arrosage** et des **stations de pompage** avec la mise en place d'une Gestion Technique Centralisée sur **4 parcs** départementaux :

- parc de l'Île Saint-Germain
- parc de l'Île de Monsieur
- parc Pierre-Lagravère
- parc de la Folie Sainte-James

Procédure : Adaptée

Contraintes particulières : label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : octobre 2025
- Début des prestations : mars 2026
- Durée des prestations : 1 an



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Entretien des espaces verts du parc des Chanteraines et du Stade Frédéric Chazottes





Entretien des espaces verts du parc des Chanteraines et du Stade Frédéric Chazottes

Objet :

Marché d'entretien des espaces verts du parc des Chanteraines et du Stade Chazottes à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.

Surface : 87 ha

Procédure : Appel d'offres ouvert

Forme : mixte (partie forfaitaire + partie à bons de commande)

Contraintes particulières : Label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : septembre 2025
- Début des prestations : février 2026
- Durée des prestations : 2 ans renouvelable 1 fois



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Entretien de la voie ferrée du parc départemental des Chanteraines





Entretien de la voie ferrée du parc départemental des Chanteraines

Objet de l'opération :

Maintenance et réparation de la voie ferrée du **chemin de fer touristique** du parc des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, notamment :

- Remplacement de traverses, mise en place de ballast
- Fourniture, dépose et repose de rails, d'aiguillages, etc.
- Reprise de bordures de quai, et de nivellement de voie

En chiffres : 5 kms de voies, 6 stations

Procédure : Adaptée

Contraintes particulières : Label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : juin 2025
- Début des prestations : décembre 2025
- Durée : 2 ans renouvelable 1 fois



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Entretien des arbres sur les routes départementales





Entretien des arbres sur les routes départementales

Objet du marché :

Prestations d'entretien arboricole (**élagages**, **abattages**, **essouchages** et **soins** aux arbres) sur les routes départementales et les espaces verts d'accompagnement

Forme du marché :

accord cadre à bons de commande ; lot **unique** ; appel d'offres ouvert

- Montant mini prévisionnel : 300 000 € HT
- Montant maxi prévisionnel : 1 000 000 € HT

Qualifications particulières ou équivalentes :

- E142 : Elagage
- H221: Elagage dans l'environnement de lignes BT ou HTA
- H125: Routes, autoroutes et grandes infrastructures

Calendrier prévisionnel :

- **Publicité** : juin 2025 au plus tôt
- **Début du marché** : fin 2025
- **Durée** : 2 ans reconductible 1 fois



© CD92

**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025





Entretien arboricole dans les parcs départementaux - 4 lots





Entretien arboricole dans les parcs départementaux - 4 lots

Objet du marché :

Prestations d'entretien arboricole : **abattages**, **élagages**, **essouchage**, et divers **soins** aux arbres, dans les parcs, jardins, les espaces de nature et toutes les propriétés départementales.

Forme du marché :

accord cadre à bons de commande. 4 lots **géographiques**.

Montants annuels prévisionnels : mini 150 K€ / maxi 600 K€ pour chacun des lots

Contraintes particulières : Respect du label Eve®

Qualification ou équivalence : E142 - Elagage

Dates prévisionnelles :

- Publicité : 3^e trimestre 2025
- Début prévisionnel : 1^{er} trimestre 2026
- Durée des prestations : 2 ans reconductible 1 fois

Procédure : Appel d'offres



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Diagnostic et protection des végétaux - 3 lots





Diagnostic et protection des végétaux - 3 lots

Allotissement : 3 lots :

- Lot 1 : **Diagnostics** phytosanitaires et plans de gestion forestiers
- Lot 2 : **Protection** phytosanitaire et lutte antiparasitaire
- Lot 3 : **Analyses** tensiométriques et dendrométriques

Montants annuels de l'accord-cadre à bons de commande :

- Lot 1 : minimum 150 000€ HT / maximum 600 000 € HT
- Lot 2 : minimum 150 000€ HT / maximum 600 000 € HT
- Lot 3 : minimum 50 000€ HT / maximum 250 000 € HT

Contraintes particulières : label Eve®

Dates prévisionnelles :

- Publicité : juin 2025
- Début des marchés : décembre 2025
- Durée : 2 ans, reconductible 1 fois

Procédure : Appel d'offres ouvert



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





Maintenance et fourniture des équipements de jeux et parcours sportifs dans les parcs et jardins





Maintenance et fourniture des équipements de jeux et parcours sportifs dans les parcs et jardins

Objet :

- Partie forfaitaire : **Maintenance préventive** (interventions périodiques de contrôle et entretien des aires de jeux)
- Partie à bons de commande : **Maintenance corrective**, réparations, rénovations des jeux et équipements

Procédure : Appel d'offres ouvert

Surface : Une vingtaine de sites (parcs et établissements sociaux), comportant une ou plusieurs aires de jeux

Contraintes particulières : Label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- **Publicité (AAPC)** : mai 2025
- **Début du marché**: octobre 2025
- **Durée des prestations** : **2 ans** reconductible 1 fois



© CD92





Maintenance de l'automatisation des portes, portails et fermetures automatisées





Maintenance de l'automatisation des portes, portails et fermetures automatisées

Objet :

Accord-cadre à bon de commande.

Maintenance préventive, corrective, réparations, **rénovations** des équipements

Procédure : Appel d'offres ouvert

Surface : Une vingtaine de sites (parcs et établissements sociaux)

Contraintes particulières :

- Label Eve®

Calendrier prévisionnel :

- Publicité (AAPC) : mars 2025
- Début des prestations : juillet 2025
- Durée des prestations : 2 ans reconductible 1 fois



© CD92

Rencontre Fournisseurs
Infrastructures

06 février 2025





DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE - EAU

Direction de l'eau

SYLVIE DRIOLLET - Directrice





Assainissement:

Le système départemental d'assainissement:

- 629 km de réseau public dont 397 km visitables
- 38 stations de pompage, 27 déversoirs d'orages automatisés, 85 points de rejet en Seine, Gestion centralisée : 458 sites de mesures

Exploitation par voie de délégation de service public (SEVESC).

Le patrimoine privé départemental : réseaux et ouvrages d'assainissement du domaine de Jardy

Les objectifs

- Transporter, collecter les eaux usées et pluviales
- Réduire les déversements en Seine
- Réduire les inondations par débordement
- Un réseau amélioré et réhabilité en continu.

Berges de Seine et milieux naturels

- 39 km de Seine et 66km de berges
- Études et travaux d'aménagement de berges

Les objectifs

- Réalisation de la promenade bleue entre Paris et les Yvelines (39 km)
- Ramassage des flottants sur la Seine
- Amélioration de la qualité de l'eau de l'ensemble des milieux aquatiques


Protection de l'environnement :

Engagement par un système de management environnemental
Certification ISO 14001 depuis 2003

⇒ Budget général 2025: 6,8 M €

⇒ Budget annexe d'assainissement 2025: 15,6 M €



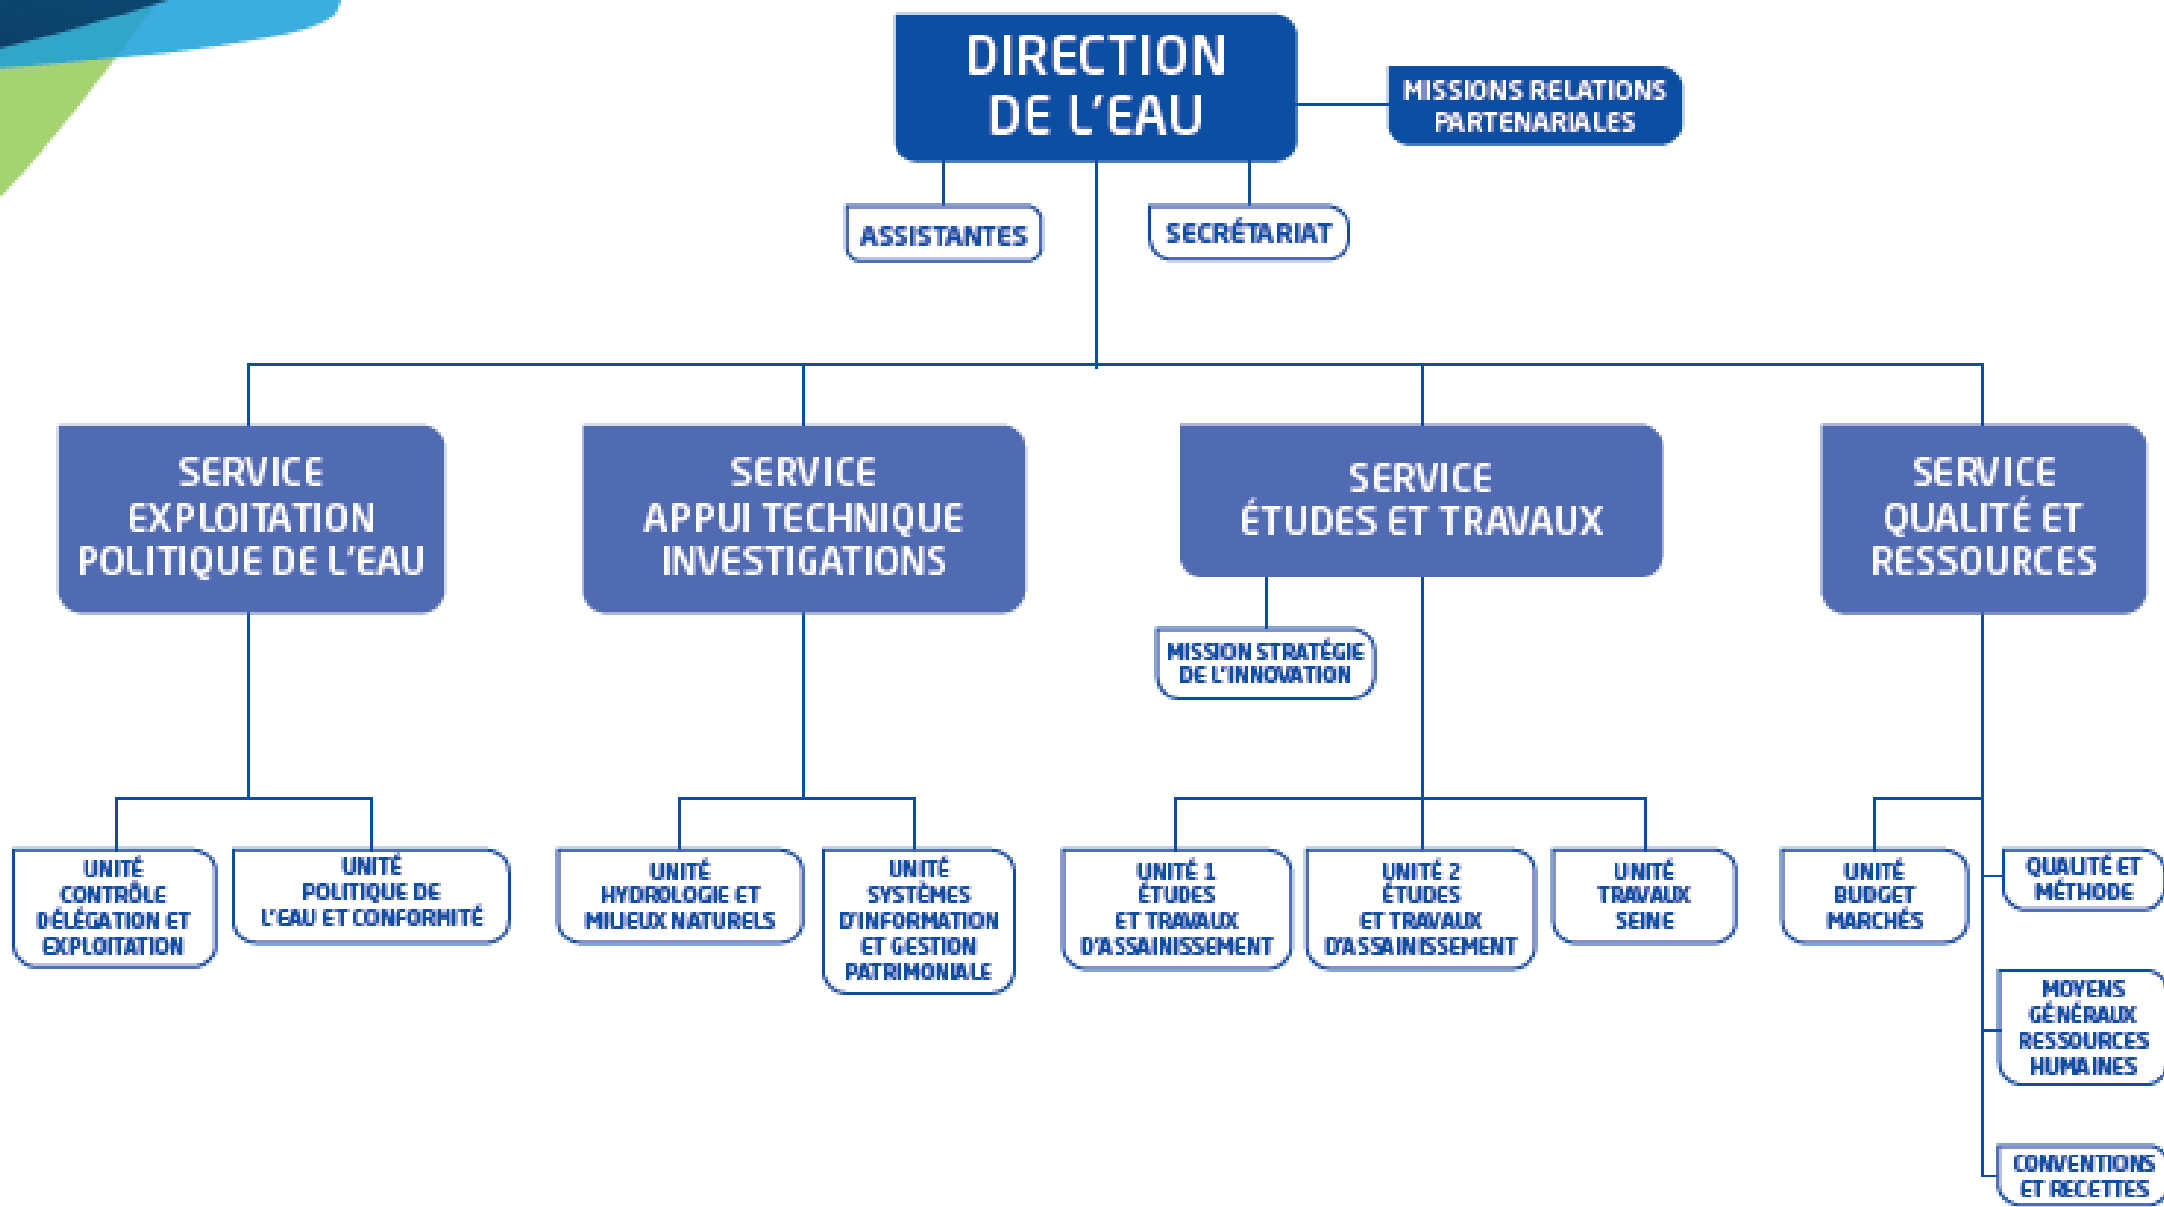



Direction de l'eau

Etudes hydrauliques et milieu naturel





Etablissement de profils de baignade - site de baignade de Sèvres

Contexte: projet d'ouverture d'un site de baignade pérenne à Sèvres conformément aux dispositions de la Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Le marché vise à établir un profil de baignade comportant une évaluation:

- des caractéristiques géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des eaux de surface de leur bassin versant,
- des pollutions et de leurs sources,
- des mesures de gestion.

Il comprend une phase d'état des lieux, une phase de modélisation et une phase de propositions sur les mesures de gestion.



Date prévisionnelle AAPC : Septembre 2025

Début prestations : Avril 2026

Fin prestations : Printemps 2030

Procédure de marché : MAPA





Audit de l'autosurveillance

Contexte: L'arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 impose la réalisation d'un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance du système de collecte à tous les maîtres d'ouvrages.

Le marché vise à établir les modalités de réalisation de ce contrôle technique, conformément aux exigences détaillées par les autorités (document attendu début 2025), par un organisme compétent et indépendant.

Le contrôle porte sur l'ensemble des points de surveillance

Mesure de vitesse US / doppler
immergé



Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2025

Début prestations : Avril 2026

Fin prestations : Septembre 2027

Procédure de marché : MAPA





Direction de l'eau

Assainissement – Travaux neufs






Travaux de reconstruction du diffuseur en Seine dans le Parc Lagravère à Colombes

Travaux de reconstruction du diffuseur en Seine du réseau départemental d'assainissement situé dans le Parc Lagravère à Colombes. L'ouvrage de rejet existant est particulièrement vétuste et ne respecte pas les préconisations du Service de la Navigation de la Seine.

Les travaux comprennent notamment :

- la réalisation d'une enceinte étanche via notamment des pieux sécants et des injections de sol,
- la réalisation du nouveau diffuseur cadre rectangulaire de 2,50m de hauteur et de largeur variant de 2,50 m à 9,20 m
- la réalisation d'une chambre de raccordement,
- la mise en service du nouveau diffuseur avec :
 - ouverture du rideau de palplanches
 - démolition de l'ancien diffuseur avec fermeture du rejet

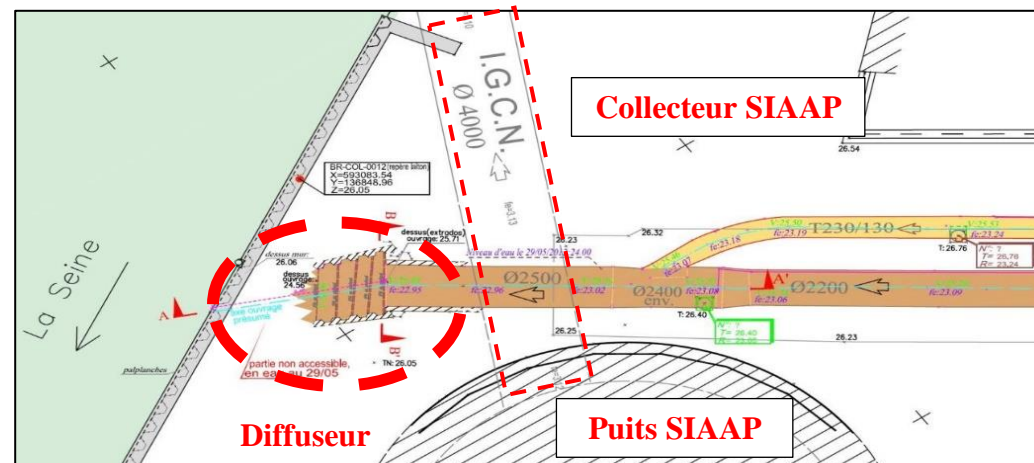

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Fin prestations : 2^{ème} trimestre 2027 (hors GPA)

Procédure de marché : MAPA





Travaux de métrologie et instrumentation du réseau départemental d'assainissement

Les travaux feront l'objet d'un marché sous forme d'un Accord Cadre mono attributaire.

Il s'agit de travaux de création, de modification, déplacement ou dépose de capteurs, équipements et stations de mesures permanentes dans les réseaux et ouvrages d'assainissement du département.

Ils comprennent entre autres :

- Les prestations d'études d'exécution,
- Les travaux de voirie et de génie civil nécessaires à la mise en œuvre des points de mesure,
- La mise en œuvre des points de mesures et tout matériel annexe (câblage électrique et logiciels),
- La pose d'équipements pour l'accès et la sécurité des sites (plateformes de travail, passerelles, rampe, regard de visite, etc..).

Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} trimestre 2025

Début prestations : 3^{ème} trimestre 2025

Fin prestations : 3^{ème} trimestre 2029 (durée 4 ans)

Procédure de marché : AOO






Travaux neufs de génie civil et d'équipements d'amélioration du réseau départemental d'assainissement

Les travaux feront l'objet d'un marché sous forme d'un Accord Cadre mono attributaire.

Les prestations concernent les travaux neufs de génie-civil et d'équipements pour des interventions localisées visant à l'amélioration du réseau d'assainissement départemental des Hauts-de-Seine :

- Travaux de génie civil de toutes natures, réalisés à ciel ouvert (tranchée, puits...) ou en souterrain (toutes méthodes) ;
- Fourniture et pose de canalisations de toutes natures en tranchée, en puits ou en souterrain ;
- Fourniture, pose et mise en service d'équipements d'assainissement : vanne, batardeaux, métallerie...

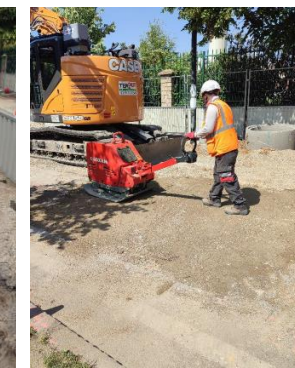

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 4^{ème} trimestre 2025

Fin prestations : 4^{ème} trimestre 2029 (Durée : 4 ans)

Procédure de marché : AOO



**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025





Direction de l'eau

Assainissement – Réhabilitation





Travaux de réhabilitation du collecteur avenue de la Paix à Châtillon - Expérimentation et évaluation de l'usage d'un mortier « innovant »

Travaux de réhabilitation du collecteur départemental visitable 190/100 avenue de la Paix à Châtillon sur 788 ml, et branchements et ouvrages associés.

Objectif: tester un mortier de réhabilitation renforcé de fibres métalliques amorphes.

Les travaux comprennent (3 lots):

Lot 1 (génie civil):

- Des chemisages structurant et non structurant en **béton classique** en voûte et piédroits sur 564 ml (265ml et 299ml), et un chemisage structurant en **béton renforcé de fibres métalliques amorphes** en voûte et piédroits sur 224 ml,
- Le reprofilage et la réfection du radier en béton armé classique ou renforcé de fibres métalliques amorphes ainsi que la mise en œuvre d'enduit anti-abrasif selon les zones.

Lot 2: injections de collage régénération

Lot 3: réhabilitation de 106 branchements non visitables



Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Fin prestations : 2^{ème} trimestre 2027

Procédure de marché : MAPA





Marché de Contrôles Qualité dans le cadre de la réhabilitation du collecteur avenue de la Paix à Châtillon

Prestations de contrôles qualité liées au chantier de réhabilitation du collecteur départemental visitable 190/100 avenue de la Paix à Châtillon sur 788 ml et des branchements associés.

Particularités :

- Tests et comparaisons de 2 mortiers de réhabilitation : un mortier de réhabilitation renforcé de fibres métalliques amorphes et un mortier classique
- Essais et contrôles à réaliser jusqu'à 5 ans après la fin du marché de travaux



Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2025

Début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Fin prestations : 2^{ème} trimestre 2032

Procédure de marché : AOO





Travaux de réhabilitation du collecteur avenue de la République à Montrouge

Travaux de réhabilitation du collecteur départemental visitable 230/130 avenue de la République à Montrouge sur 1030 ml ainsi que des 145 branchements non visitables et ouvrages annexes associés, entre la Rue Max Dormoy et l'avenue Gabriel Péri.

Les travaux comprennent (3 lots):

Lot 1 : génie civil

- Un chemisage structurant en béton projeté armé en voute et piédroits,
- Le reprofilage et la réfection du radier en béton armé et mise en œuvre d'enduit anti-abrasif,
- L'aménagement de 3 regards en regards double avec palier, la création de 2 regards et la réhabilitation des regards existants,

Lot 2: des injections de collage régénération sur toute la section

Lot 3: des travaux de réhabilitation sur les branchements non visitables (remplacement, gainage ou comblement)



Date prévisionnelle AAPC : 3^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Fin prestations : 4^{ème} trimestre 2027

Procédure de marché : AOO





Travaux de réhabilitation du collecteur avenue Le Corbeiller et bd Anatole France à Meudon

Travaux de réhabilitation du collecteur départemental visitable 180/100 avenue Le Corbeiller et bd Anatole France à Meudon sur 667 ml ainsi que des 67 branchements non visitables et ouvrages annexes associés, entre le bd des Nations unies et la rue des Sorbières.


Les travaux comprennent (3 lots):

Lot 1 : génie civil

- Un chemisage structurant en béton projeté armé en voute et piédroits,
- Le reprofilage et la réfection du radier en béton armé et mise en œuvre d'enduit anti-abrasif,
- Le déport de 7 regards de visite, la réhabilitation des 7 autres regards existants,

Lot 2: des injections de collage régénération en partie basse sur 260 ml et sur toute la section sur 407 ml,

Lot 3: des travaux de réhabilitation sur les branchements non visitables (remplacement, gainage ou comblement)

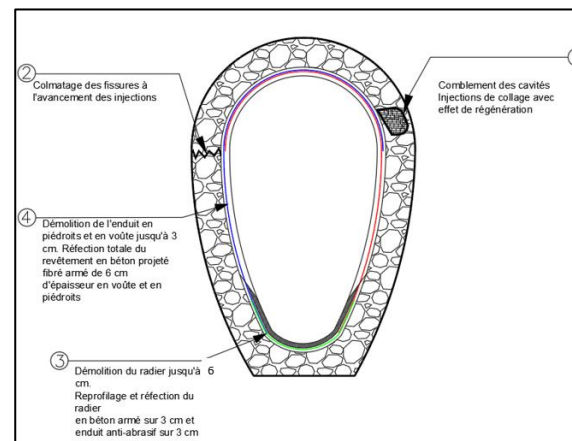

Date prévisionnelle AAPC : 3^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Fin prestations : 3^{ème} trimestre 2027

Procédure de marché : MAPA





Travaux de réhabilitation de collecteurs visitables avenue Aristide Briand (RD920) à Bagneux, Bourg-La-Reine et Montrouge

Travaux de réhabilitation des collecteurs départementaux unitaires visitables avenue Aristide Briand (RD920) et ouvrages annexes associés à Bagneux, Bourg La Reine et Montrouge

2,9 km de collecteurs et 221 branchements non visitables :

Tronçon 1 : coll. 180/90 entre l'avenue Albert Petit et la rue des Meuniers : 300 ml et 17BP NV

Tronçon 2 : coll. 190/100 entre l'avenue des Fleurs et la rue du Port Galand : 311 ml et 27BP NV

Tronçon 3 : coll. 180/100 et 200/100 entre la rue d'Arcueil et le bd R. Rolland : 988 ml et 96 BP NV

Tronçon 4 : coll. 180/100 et 200/100 entre le Bd R. Rolland et la rue Carves : 883 ml et 69BP NV

Tronçon 5 : coll. 200/100 entre la rue J-M. Naudin et l'impasse Villa Moderne : 446 ml et 12BP NV

Les travaux comprennent selon les tronçons :

Des travaux de génie civil :

- Réfection ponctuelle d'enduits
- Réfection généralisée des enduits en piédroits et chemisage structurant en voûte
- Un chemisage structurant en voûte et piédroits
- Le reprofilage et la réfection du radier

Des travaux d'injection de collage régénération en partie basse ou sur toute la section

Des travaux de réhabilitation des branchements non visitables (remplacement, gainage ou comblement)

Allotissement envisagé : 1 lot Injections (pour les 5 tronçons)

4 lots Génie civil + Branchements (Tr 1 & 2 - Tr 3 – Tr 4 – Tr5)



Date prévisionnelle AAPC : 3^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Fin prestations : 1^{er} trimestre 2028

Procédure de marché : AOO

**Rencontre Fournisseurs
Infrastructures**

06 février 2025



Marchés en cours de consultation

Marché en diffusion	
<p>Marché d'Auscultation des ouvrages d'assainissement départementaux en vue de leur réhabilitation (AC Mono-attributaire de 4 ans)</p>	<p>Procédure Marché : AOO</p> <p>DLR des offres : 26/02/2025</p> <p>Début des prestations : 3^{ème} trimestre 2025</p>
<p>Marché de Travaux de réhabilitation, de renforcement du réseau d'assainissement et de ses ouvrages annexes (AC Mono-attributaire de 4 ans)</p>	<p>Procédure Marché : AOO</p> <p>DLR des offres : ... /02/2025</p> <p>Début des prestations : 3^{ème} trimestre 2025</p>





Direction de l'eau

Aménagement des berges de Seine





Travaux de réaménagement des berges de Seine aval à Courbevoie entre le Pont de Courbevoie et le Parc de Bécon

Travaux d'aménagement d'une promenade en berge sur 550 ml à Courbevoie entre le Pont de Courbevoie et le Parc de Bécon :


- Génie civil / Génie fluvial : Terrassement, création d'une promenade en encorbellement, mise en œuvre d'une fondation sur pieux, installation de deux salons en surplomb de la Seine et d'une barge végétalisée, mise en place de ducs d'albe de protection, réfection du perré maçonné...
- VRD : Intégration d'un éclairage d'ambiance, déploiement d'un réseau d'arrosage, traitement qualitatif des sols, intégration de mobiliers urbains (pergolas, assises, lits de soleil, tables, agrès sportifs, aire de jeux,...)...
- Serrurerie : Installation de clôtures, portails, portillons, garde-corps, mains-courantes,...
- Aménagement paysager : Abattage, dessouchage, création de bandes d'espaces verts, d'îlot végétal et de massifs fleuris, installation de jardinières, végétalisation d'une barge flottante...

Date prévisionnelle AAPC : 1^{er} trimestre 2025

Début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Fin prestations : 2^{ème} semestre 2028

Procédure de marché : AOR

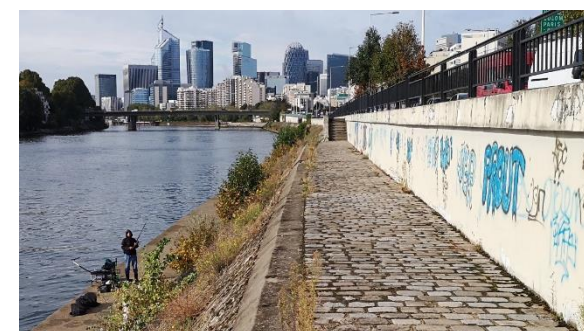



Travaux de réaménagement des berges de Seine à Asnières entre le Pont d'Asnières et le Pont de Clichy

Travaux d'aménagement des berges : réalisation d'une promenade bleue sur 800 ml à Asnières entre le Pont d'Asnières et le Pont de Clichy :

- Génie civil / Génie fluvial : Terrassement, démolition d'une estacade, remodelage du terrain naturel, aménagement d'une promenade flottante, installation de pieux de guidage, ducs d'albe et de passerelles, mise en œuvre de murs de soutènement, viabilisation des emplacements des bateaux logement
- VRD : Intégration d'un éclairage d'ambiance, traitement des sols avec des matériaux qualitatifs, intégration de mobiliers urbains (Chaises, bancs,...)
- Serrurerie : Installation de clôtures, Portails, Portillons, garde-corps, mains-courantes,...
- Aménagement paysager : Mise en place d'enrochement, création d'un cortège végétal de type ripisylve et de zone humide, traitement paysager des abords du parc, mise en place de jardinières flottantes

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 1^{er} trimestre 2026

Fin prestations : 2^{ème} trimestre 2028

Procédure de marché : AOR





Concours de Maitrise d'Œuvre d'aménagement des berges de Puteaux et Suresnes entre les ponts de Suresnes et Puteaux

Concours de maitrise d'œuvre relatif à l'aménagement des berges de Puteaux et Suresnes sur 1270 ml entre les ponts de Suresnes et Puteaux.

L'objectif principal du projet est de reconnecter les deux villes et leurs habitants au fleuve à travers 3 enjeux principaux :

- Aménager une promenade accessible à tous, sécurisée et agréable en bord de Seine,
- Faire bénéficier les habitants de Puteaux et de Suresnes d'un site naturel de proximité,
- Faciliter l'accès aux berges de Seine depuis les centres-villes.

Date prévisionnelle AAPC : 2^{ème} trimestre 2025

Début prestations : 2^{ème} trimestre 2026

Fin prestations : 3^{ème} trimestre 2032

Procédure de marché : AOO





Autres marchés à venir

Marchés à lancer	Lieu	Date AAPC (trim)
Marché Accord Cadre CSPS de catégorie 1 (4 ans) pour les travaux liés au réseau d'assainissement et à l'aménagement et la protection des berges de Seine	Tout le département	1 ^{er} trimestre 2025
Marché Accord Cadre CSPS de catégories 2 et 3 (4 ans) pour les travaux liés au réseau d'assainissement et à l'aménagement et la protection des berges de Seine	Tout le département	2 ^{ème} trimestre 2025





Merci de votre attention





Informations utiles

Vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à compter du 7 février à l'adresse suivante:

<https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs>





Avez-vous des Questions ?

Souhaitez-vous des Précisions ?

Aimeriez-vous des Compléments ?





*Un grand merci
pour votre participation ce jour.*

